

标识号	_	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
1	0	*	启动	10 个工作日	2019年10日10	2018年10月23日		程序员A[50%],ι	¥224,981.50
2	•	<u>^</u>	任命项目经理	3 个工作日		2018年10月23日		程序员C,测试人员	
3	:	*	组建核心团队	3 个工作日		2018年10月12日		ui专家,架构师,项	
4	:	*	指定时间计划	3 个工作日		2018年10月18日		项目经理,ui专家	¥4,811.00
5	1	^	分析干系人	3 个工作日		2018年10月18日		项目经理,ui专家 项目经理,ui专家	
6	1	^		3个工作日		2018年10月19日		ui专家,架构师,项	
7	I	*							
	I	×		3个工作日		2018年10月24日		架构师,项目经理	
8	<u> </u>	X	规划	3 个工作日		2018年10月17日		ui专家,测试人员	
9	<u> </u>	*	规划范围	3 个工作日		2018年10月17日		项目经理,ui专家	
10	<u>. </u>	*	1制定需求说明书			2018年10月17日		项目经理,ui专家	¥4,811.00
11	Ţ	*	2.界面设计	3 个工作日		2018年10月18日		项目经理,ui专家	¥4,811.00
12	<u> </u>	*	3.详细设计说明书			2018年10月19日		项目经理,ui专家	
13	I	*		3个工作日		2018年10月22日		项目经理,ui专家	
14	Ţ	*		3个工作日		2018年10月23日		项目经理,ui专家	
15	Ţ	*		3个工作日		2018年10月23日		项目经理,ui专家	· ·
16	<u>.</u>	*	规划时间	3 个工作日		2018年12月3日		ui专家	¥26,285.00
17	!	*	1.估算资源	3 个工作日		2018年12月3日		架构师,项目经理	
18	•	*		3 个工作日		2018年12月4日		架构师,项目经理	
19	•	*		3 个工作日		2018年12月4日		架构师,项目经理	
20	•	*	4.排列工作包顺序			2018年12月4日		架构师,项目经理	
21	•	*	规划成本	3 个工作日	2018年12月3日	2018年12月5日		ui专家	¥14,443.00
			Task		Inactive Summary		External Tasks		_
			Split		Manual Task		External Milestone	⇔	
			Milestone	<u> </u>	Duration-only		Deadline	• V	
Project	:: 简单	单项目计划			ŕ	D. II		<u> </u>	
Date: 2	Date: 2019年6月18日		Summary	1	Manual Summary	Rollup	Progress		
		Project Summa		/	Manual Summary	-	Manual Progress		
			Inactive Task		Start-only	L			
			Inactive Milestor	ne 💠	Finish-only]			
					Page	1			

标识号	1	任务模式(任务名称		工期		开始	时间	完成时	t间	前置	置任务	资源名	称	成本	
22		*	1.项	目成本估算	3 个工	作日	2018	8年12月3日	2018 1	丰12月5日	20		ui专家	、,架构师,工	页	¥6,021.00
23	,	*	2.项	目预算	3个工	作日	2018	8年12月4日	2018	年12月6日			ui专家	、架构师,工	页	¥6,021.00
24	,	*	规划员	量	3 个工	作日	2018	8年12月5日	20183	年12月7日			ui专家	以,架构师,〕		¥18,063.00
25	,	*	制定	≧测试计划	3个工	作日	2018	8年12月5日	2018	年12月7日			ui专家	、架构师,工	页	¥6,021.00
26	,	*	制定	≧测试用例	3个工	作日	2018	8年12月6日	2018	年12月10日	25		ui专家	、架构师,工	页	¥6,021.00
27	,	*	规划人	し カ	3 个工	作日	2018	8年12月7日	2018	年12月11日			ui专家	ア,架构师,1		¥18,063.00
28	,	*	1.制	定人力资源	3个工	作日	2018	8年12月7日	2018	年12月11日			ui专家	、架构师,工	页	¥6,021.00
29	,	*		定人员配备 理计划	3 个工	作日	2018	8年12月10日	20184	年12月12日	28		ui专家 项目组	《,架构师, 2理		¥6,021.00
30	,	*	规划人	人力资源	3 个工	作日	2018	8年12月9日	20183	年12月11日			ui专家	ア,架构师,1		¥18,063.00
31	,	*	1.指	定人自立原计	3个工	作日	2018	8年12月9日	2018	年12月11日			ui专家	、,架构师,工	页	¥6,021.00
32	,	*		定人员配备 胆计划	3 个工	作日	2018	8年12月10日	20184	年12月12日	31		ui专家 项目组	《,架构师, 2理		¥6,021.00
33	,	*	规划沟	规划沟通		作日	2018	8年12月13日	2018	年12月17日			ui专家	《,架构师》	G	¥12,042.00
34	,	*	制元	定沟通管理计	3个工	作日	2018	8年12月13日	2018	年12月17日			ui专家	、架构师,工	页	¥6,021.00
35	,	*	规划系	E购	3 个工	作日	2018	8年12月14日	2018	年12月18日			ui专家	《,架构师》	G	¥18,063.00
36	,	*	自制	引外购分析	3个工	作日	2018	8年12月14日	2018	年12月18日			ui专家	、,架构师,工	页	¥6,021.00
37	i 2	*	制定	≅采购文件	3个工	作日	2018	8年12月17日	2018	年12月19日	36		ui专家	、,架构师,工	页	¥6,021.00
38	i 2	*	规划区	1.险	3 个工	作日	2018	8年12月18日	20183	年12月20日			ui专家	以,架构师,〕	0	¥30,105.00
39	i 2	*	识别	川风险	3个工	作日	2018	8年12月18日	2018	年12月20日			ui专家	、,架构师,工	页	¥6,021.00
40		*	风路	金分析	3个工	作日	2018	8年12月19日	2018	年12月21日	39		ui专家	、架构师,工	页	¥6,021.00
41		*	制定	■风险分析册	3个工	作日	2018	8年12月20日	20184	丰12月24日	40		ui专家	、架构师,工	页	¥6,021.00
				Task			lı	nactive Summary				External Tasks				
				Split			1	Manual Task				External Milestone	> و	\Diamond		
				Milestone		♦		Ouration-only				Deadline		.		
Project: 简单项目计划 Date: 2019年6月18日			Summary				Manual Summary	Rollup I			Progress					
			Project Summary	,			Manual Summary			-1	Manual Progress					
				Inactive Task				Start-only		-		 				
				Inactive Milestor	ie	\Diamond		inish-only		_						
								Page	2							

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
	o		I= 15.1±6. A					() +-1()	
42	•	*	规划整合	3个工作日		2018年12月25日	41	ui专家,架构师,项	¥6,021.00
43	•	*	执行与监控	3 个工作日		2018年12月25日		ui专家,架构师,邛	¥8,042.00
44	•	*	组建项目团队	1个工作日		2018年12月22日		ui专家,架构师,项	¥2,021.00
45	•	-5	项目执行	35 个工作日	2018年12月23日			ui专家	¥1,033,451.00
46	Ť	*	用户模块	4 个工作日	2018年12月23日	2018年12月26日		测试人员A,测试	¥340,295.00
47	Ť	*	首页	1个工作日	2018年12月23日	2018年12月23日		测试人员A,测试,	¥42,763.00
48	Ť	*	评论	1个工作日	2018年12月24日	2018年12月24日	47	测试人员A,测试,	¥42,763.00
49	ŧ	*	登录注册	1个工作日	2018年12月25日	2018年12月25日	48	测试人员A,测试,	¥42,763.00
50	Ť	*	内容推荐	1个工作日	2018年12月26日	2018年12月26日	49	测试人员A,测试,	¥42,763.00
51	Ť	*	游戏资讯模块	3 个工作日	2018年12月27日	2018年12月31日		测试人员A,测试	¥255,372.00
52	ŧ	*	游戏资讯	1个工作日	2018年12月28日	2018年12月28日		测试人员A,测试,	¥42,763.00
53	ŧ	*	评论	1个工作日	2018年12月31日	2018年12月31日	52	测试人员A,测试,	¥42,763.00
54	ŧ	*	推荐	1个工作日	2019年1月1日	2019年1月1日	53	测试人员A,测试,	¥42,763.00
55	Ť	*	动漫资讯模块	3 个工作日	2019年1月1日	2019年1月3日		测试人员A,测试	¥255,372.00
56	Ť	*	动漫资讯	1个工作日	2019年1月1日	2019年1月1日		测试人员A,测试,	¥42,763.00
57	Ť	*	p评论	1个工作日	2019年1月2日	2019年1月2日	56	测试人员A,测试,	¥42,763.00
58	Ť	*	推荐	1个工作日	2019年1月3日	2019年1月3日	57	测试人员A,测试,	¥42,763.00
59	ŧ	*	电台模块	3 个工作日	2019年1月4日	2019年1月8日		测试人员B,测试,	¥19,572.00
60	ŧ	*	图片轮播	1个工作日	2019年1月5日	2019年1月5日		测试人员B,测试,	¥3,333.00
61	ŧ	*	介绍轮播	1个工作日	2019年1月7日	2019年1月7日	60	测试人员B,测试,	¥3,333.00
62	ŧ	*	音频播放	1个工作日	2019年1月8日	2019年1月8日	61	测试人员B,测试,	¥3,333.00
			1						
			Task		Inactive Summary		External Tasks		
			Split		Manual Task		External Mileston	e ♦	
.	~~ \	소국로 다 그 도시	Milestone	♦	Duration-only		Deadline	•	
,		色项目计划 E6日19日	Summary		Manual Summary	Rollup	Progress		_
Date. 2	Date: 2019年6月18日		Project Summar	у Г	Manual Summary		Manual Progress		
			Inactive Task		Start-only	Е			
			Inactive Milesto	ne 💠	Finish-only	3			
			1		Page	3			

0			工期		始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	
63	*	周边商城模块	-			2019年1月11日		测试人员B,测试。		
64	*	商品展示			19年1月10日	2019年1月10日		测试人员B,测试 <i>。</i>	·	
65	*	商品信息	1个工	.作日 20	19年1月11日	2019年1月11日	64	测试人员B,测试 <i>,</i>	¥3,333.00	
66	*	购物车	1个工	.作日 20)19年1月14日	2019年1月14日	65	测试人员B,测试。	¥3,333.00	
67	*	商家模块	4 个エ	.作日 20	19年1月12日	2019年1月16日		测试人员B,测试。	¥26,025.00	
68	*	商家管理界	中面 1个工	.作日 20)19年1月13日	2019年1月13日		测试人员B,测试。	¥3,333.00	
69	*	买家购买信	言息 1个工	作日 20)19年1月14日	2019年1月14日	68	测试人员B,测试。	¥3,333.00	
70	*	卖家信息	1 个工	.作日 20)19年1月15日	2019年1月15日	69	测试人员B,测试。	¥3,333.00	
71	*	买家购买信	言息 1个工	.作日 20	19年1月16日	2019年1月16日	70	测试人员B,测试。	¥3,333.00	
72	*	管理员模块	4 个エ	.作日 20	19年1月17日	2019年1月22日		测试人员B,测试。	¥26,025.00	
73	*	信息管理	1 个工	作日 20	19年1月18日	2019年1月18日		测试人员B,测试。	¥3,333.00	
74	*	发布广告	1 个工	.作日 20	19年1月21日	2019年1月21日	73	测试人员B,测试	¥3,333.00	
75	*	统计分析	1 个工	.作日 20	19年1月22日	2019年1月22日	74	测试人员B,测试	¥3,333.00	
76	*	备份	1个工	.作日 20	19年1月23日	2019年1月23日	75	测试人员B,测试	¥3,333.00	
77	*	项目监控	4 个エ	.作日 20	19年1月23日	2019年1月28日		ui专家	¥14,245.00	
78	*	各项指标。	监控 1个工	.作日 20	19年1月23日	2019年1月23日		ui专家,程序员C,势	¥2,761.00	
79	*	资金安全	监控 1个工	.作日 20	19年1月24日	2019年1月24日	78	ui专家,程序员C,续	¥2,761.00	
80	*	变更评审	1个工	.作日 20	19年1月25日	2019年1月25日	79	ui专家,程序员C,势	¥2,761.00	
81	*	例会	1个工	.作日 20	19年1月28日	2019年1月28日	80	ui专家,程序员C,势	¥2,761.00	
82	*	管理干系人	3 个工	.作日 20	19年1月29日	2019年1月31日		ui专家,程序员C,	¥16,324.00	
83	*	发布项目	信息 1个工	.作日 20	19年1月29日	2019年1月29日		ui专家,程序员C,势	¥2,761.00	
ĺ		Task			Inactive Summary		External Tasks			
		Split			Manual Task		External Milestone	•		
		Milesto	one	♦	Duration-only		Deadline	•		
-	简单项目计划	Summa	ary		Manual Summary	Rollup	Progress			
Date: 201	19年6月18日		: Summary		Manual Summary		■ Manual Progress			
1		Inactive	•		Start-only	Е	3			
				\Diamond	Finish-only	3				
		I			Page	4				

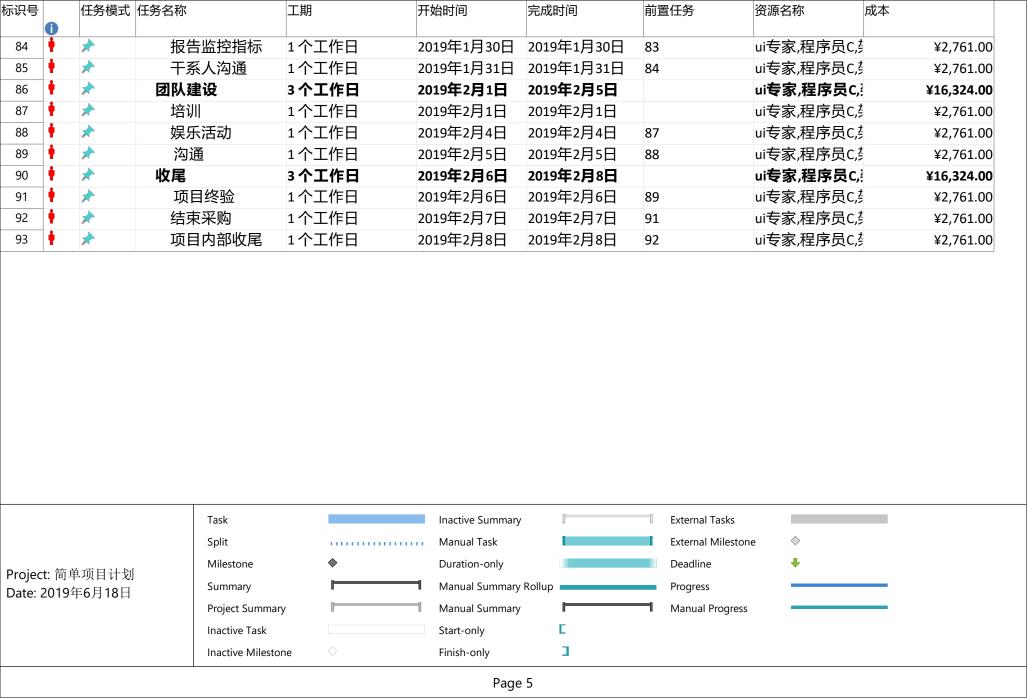

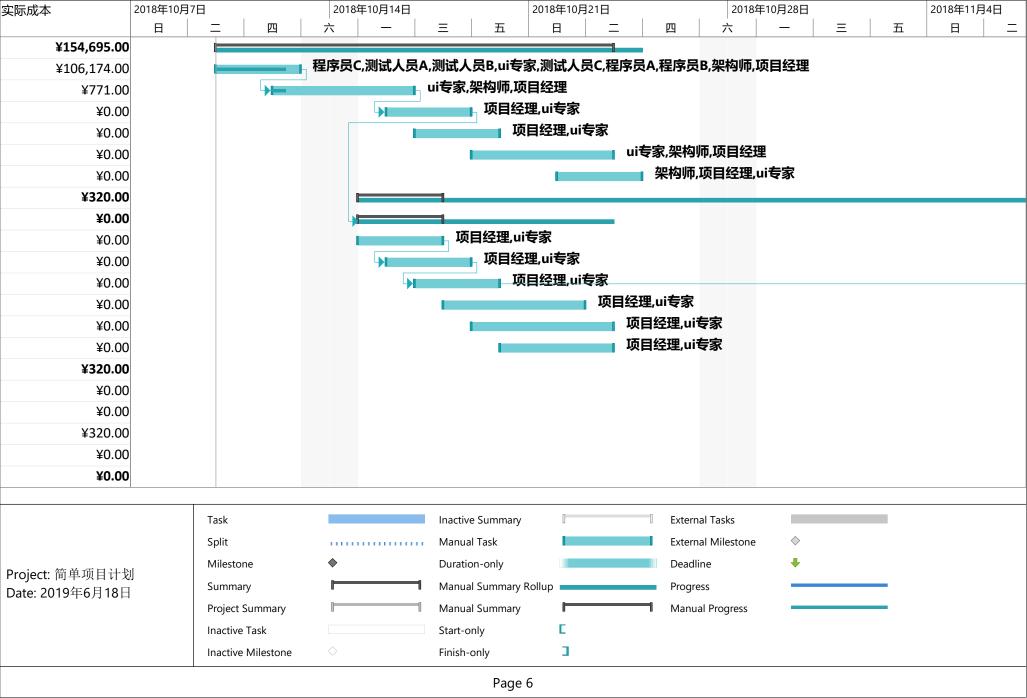

实际成本	2018年10月7日			2018	3年10月14日				21日		2018年10月28日				2018年11月	月4日
	日	=	四	六	_	Ξ	五	日	=	四	六	_	三	五	日	=
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
≢0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
¥0.00																
		Tas	sk			Inacti	ive Summary			Fxtern	al Tasks					
		Sp					ual Task				al Milestone	\Diamond				
			lestone	♦			tion-only			Deadl		•				
Project: 简单项目计划			mmary	_			ual Summary Ro	ollun		Progre		_				
Date: 2019年6月18日			oject Summary	_			ual Summary				al Progress	_				
			ictive Task	2		Start-		Ē		- 1714714						
			ictive Tusk ictive Mileston	ie \diamondsuit			n-only									
		""		· ·												
							Page 7									

