













































标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
1	  		启动	10 个工作日	2018年10月10日	2018年10月23日		程序员A[50%],ui专家	¥224,981.50
2	 		任命项目经理	3 个工作日	2018年10月10日	2018年10月12日		程序员C,测试人员	¥133,924.00
3	 		组建核心团队	3 个工作日	2018年10月12日	2018年10月16日	2	ui专家,架构师,项	¥6,021.00
4	 		指定时间计划	3 个工作日	2018年10月16日	2018年10月18日	3	项目经理,ui专家	¥4,811.00
5	 		分析干系人	3 个工作日	2018年10月17日	2018年10月19日		项目经理,ui专家	¥4,811.00
6	 		确定项目发起人	3 个工作日	2018年10月19日	2018年10月23日		ui专家,架构师,项	¥6,021.00
7	 		制定项目章程	3 个工作日	2018年10月22日	2018年10月24日		架构师,项目经理	¥6,021.00
8	 		规划	3 个工作日	2018年10月15日	2018年10月17日		ui专家,测试人员	¥330,770.00
9	 		规划范围	3 个工作日	2018年10月15日	2018年10月17日	4	项目经理,ui专家	¥33,677.00
10	 		1.制定需求说明书	3 个工作日	2018年10月15日	2018年10月17日		项目经理,ui专家	¥4,811.00
11	 		2.界面设计	3 个工作日	2018年10月16日	2018年10月18日	10	项目经理,ui专家	¥4,811.00
12	 		3.详细设计说明书	3 个工作日	2018年10月17日	2018年10月19日	11	项目经理,ui专家	¥4,811.00
13	 		4.范围说明书	3 个工作日	2018年10月18日	2018年10月22日		项目经理,ui专家	¥4,811.00
14	 		5.创建WBS	3 个工作日	2018年10月19日	2018年10月23日		项目经理,ui专家	¥4,811.00
15	 		6.形成范围基准	3 个工作日	2018年10月20日	2018年10月23日		项目经理,ui专家	¥4,811.00
16	 		规划时间	3 个工作日	2018年11月29日	2018年12月3日		ui专家	¥26,285.00
17	  		1.估算资源	3 个工作日	2018年11月29日	2018年12月3日	12	架构师,项目经理	¥6,021.00
18	 		2.估算持续时间	3 个工作日	2018年11月30日	2018年12月4日		架构师,项目经理	¥6,021.00
19	 		3.制定进度计划	3 个工作日	2018年12月1日	2018年12月4日		架构师,项目经理	¥5,821.00
20	 		4.排列工作包顺序	3 个工作日	2018年12月2日	2018年12月4日		架构师,项目经理	¥6,021.00
21	 		规划成本	3 个工作日	2018年12月3日	2018年12月5日		ui专家	¥14,443.00

Project: 简单项目计划

Date: 2019年6月18日

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
22			1.项目成本估算	3 个工作日	2018年12月3日	2018年12月5日	20	ui专家,架构师,项	¥6,021.00
23			2.项目预算	3 个工作日	2018年12月4日	2018年12月6日		ui专家,架构师,项	¥6,021.00
24			规划质量	3 个工作日	2018年12月5日	2018年12月7日		ui专家,架构师,项	¥18,063.00
25			制定测试计划	3 个工作日	2018年12月5日	2018年12月7日		ui专家,架构师,项	¥6,021.00
26			制定测试用例	3 个工作日	2018年12月6日	2018年12月10日	25	ui专家,架构师,项	¥6,021.00
27			规划人力	3 个工作日	2018年12月7日	2018年12月11日		ui专家,架构师,项	¥18,063.00
28			1.制定人力资源	3 个工作日	2018年12月7日	2018年12月11日		ui专家,架构师,项	¥6,021.00
29			2.指定人员配备管理计划	3 个工作日	2018年12月10日	2018年12月12日	28	ui专家,架构师,项目经理	¥6,021.00
30			规划人力资源	3 个工作日	2018年12月9日	2018年12月11日		ui专家,架构师,项	¥18,063.00
31			1.指定人自立原计划	3 个工作日	2018年12月9日	2018年12月11日		ui专家,架构师,项	¥6,021.00
32			2.指定人员配备管理计划	3 个工作日	2018年12月10日	2018年12月12日	31	ui专家,架构师,项目经理	¥6,021.00
33			规划沟通	3 个工作日	2018年12月13日	2018年12月17日		ui专家,架构师,项	¥12,042.00
34			制定沟通管理计划	3 个工作日	2018年12月13日	2018年12月17日		ui专家,架构师,项	¥6,021.00
35			规划采购	3 个工作日	2018年12月14日	2018年12月18日		ui专家,架构师,项	¥18,063.00
36			自制外购分析	3 个工作日	2018年12月14日	2018年12月18日		ui专家,架构师,项	¥6,021.00
37			制定采购文件	3 个工作日	2018年12月17日	2018年12月19日	36	ui专家,架构师,项	¥6,021.00
38			规划风险	3 个工作日	2018年12月18日	2018年12月20日		ui专家,架构师,项	¥30,105.00
39			识别风险	3 个工作日	2018年12月18日	2018年12月20日		ui专家,架构师,项	¥6,021.00
40			风险分析	3 个工作日	2018年12月19日	2018年12月21日	39	ui专家,架构师,项	¥6,021.00
41			制定风险分析册	3 个工作日	2018年12月20日	2018年12月24日	40	ui专家,架构师,项	¥6,021.00

Project: 简单项目计划

Date: 2019年6月18日

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
42			规划整合	3 个工作日	2018年12月21日	2018年12月25日	41	ui专家,架构师,项	¥6,021.00
43			执行与监控	3 个工作日	2018年12月22日	2018年12月25日		ui专家,架构师,项	¥8,042.00
44			组建项目团队	1 个工作日	2018年12月22日	2018年12月22日		ui专家,架构师,项	¥2,021.00
45			项目执行	35 个工作日	2018年12月23日	2019年2月8日		ui专家	¥1,033,451.00
46			用户模块	4 个工作日	2018年12月23日	2018年12月26日		测试人员A,测试	¥340,295.00
47			首页	1 个工作日	2018年12月23日	2018年12月23日		测试人员A,测试	¥42,763.00
48			评论	1 个工作日	2018年12月24日	2018年12月24日	47	测试人员A,测试	¥42,763.00
49			登录注册	1 个工作日	2018年12月25日	2018年12月25日	48	测试人员A,测试	¥42,763.00
50			内容推荐	1 个工作日	2018年12月26日	2018年12月26日	49	测试人员A,测试	¥42,763.00
51			游戏资讯模块	3 个工作日	2018年12月27日	2018年12月31日		测试人员A,测试	¥255,372.00
52			游戏资讯	1 个工作日	2018年12月28日	2018年12月28日		测试人员A,测试	¥42,763.00
53			评论	1 个工作日	2018年12月31日	2018年12月31日	52	测试人员A,测试	¥42,763.00
54			推荐	1 个工作日	2019年1月1日	2019年1月1日	53	测试人员A,测试	¥42,763.00
55			动漫资讯模块	3 个工作日	2019年1月1日	2019年1月3日		测试人员A,测试	¥255,372.00
56			动漫资讯	1 个工作日	2019年1月1日	2019年1月1日		测试人员A,测试	¥42,763.00
57			p评论	1 个工作日	2019年1月2日	2019年1月2日	56	测试人员A,测试	¥42,763.00
58			推荐	1 个工作日	2019年1月3日	2019年1月3日	57	测试人员A,测试	¥42,763.00
59			电台模块	3 个工作日	2019年1月4日	2019年1月8日		测试人员B,测试	¥19,572.00
60			图片轮播	1 个工作日	2019年1月5日	2019年1月5日		测试人员B,测试	¥3,333.00
61			介绍轮播	1 个工作日	2019年1月7日	2019年1月7日	60	测试人员B,测试	¥3,333.00
62			音频播放	1 个工作日	2019年1月8日	2019年1月8日	61	测试人员B,测试	¥3,333.00

Project: 简单项目计划

Date: 2019年6月18日

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress

Manual Progress

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
63			周边商城模块	3 个工作日	2019年1月9日	2019年1月11日		测试人员B,测试	¥19,572.00
64			商品展示	1 个工作日	2019年1月10日	2019年1月10日		测试人员B,测试	¥3,333.00
65			商品信息	1 个工作日	2019年1月11日	2019年1月11日	64	测试人员B,测试	¥3,333.00
66			购物车	1 个工作日	2019年1月14日	2019年1月14日	65	测试人员B,测试	¥3,333.00
67			商家模块	4 个工作日	2019年1月12日	2019年1月16日		测试人员B,测试	¥26,025.00
68			商家管理界面	1 个工作日	2019年1月13日	2019年1月13日		测试人员B,测试	¥3,333.00
69			买家购买信息	1 个工作日	2019年1月14日	2019年1月14日	68	测试人员B,测试	¥3,333.00
70			卖家信息	1 个工作日	2019年1月15日	2019年1月15日	69	测试人员B,测试	¥3,333.00
71			买家购买信息	1 个工作日	2019年1月16日	2019年1月16日	70	测试人员B,测试	¥3,333.00
72			管理员模块	4 个工作日	2019年1月17日	2019年1月22日		测试人员B,测试	¥26,025.00
73			信息管理	1 个工作日	2019年1月18日	2019年1月18日		测试人员B,测试	¥3,333.00
74			发布广告	1 个工作日	2019年1月21日	2019年1月21日	73	测试人员B,测试	¥3,333.00
75			统计分析	1 个工作日	2019年1月22日	2019年1月22日	74	测试人员B,测试	¥3,333.00
76			备份	1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23日	75	测试人员B,测试	¥3,333.00
77			项目监控	4 个工作日	2019年1月23日	2019年1月28日		ui专家	¥14,245.00
78			各项指标监控	1 个工作日	2019年1月23日	2019年1月23日		ui专家,程序员C,测试	¥2,761.00
79			资金安全监控	1 个工作日	2019年1月24日	2019年1月24日	78	ui专家,程序员C,测试	¥2,761.00
80			变更评审	1 个工作日	2019年1月25日	2019年1月25日	79	ui专家,程序员C,测试	¥2,761.00
81			例会	1 个工作日	2019年1月28日	2019年1月28日	80	ui专家,程序员C,测试	¥2,761.00
82			管理干系人	3 个工作日	2019年1月29日	2019年1月31日		ui专家,程序员C,测试	¥16,324.00
83			发布项目信息	1 个工作日	2019年1月29日	2019年1月29日		ui专家,程序员C,测试	¥2,761.00

Project: 简单项目计划

Date: 2019年6月18日

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only

External Tasks

External Milestone

Deadline


Progress

Manual Progress

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本
84			报告监控指标	1 个工作日	2019年1月30日	2019年1月30日	83	ui专家,程序员C,彭	¥2,761.00
85			干系人沟通	1 个工作日	2019年1月31日	2019年1月31日	84	ui专家,程序员C,彭	¥2,761.00
86			团队建设	3 个工作日	2019年2月1日	2019年2月5日		ui专家,程序员C,彭	¥16,324.00
87			培训	1 个工作日	2019年2月1日	2019年2月1日		ui专家,程序员C,彭	¥2,761.00
88			娱乐活动	1 个工作日	2019年2月4日	2019年2月4日	87	ui专家,程序员C,彭	¥2,761.00
89			沟通	1 个工作日	2019年2月5日	2019年2月5日	88	ui专家,程序员C,彭	¥2,761.00
90			收尾	3 个工作日	2019年2月6日	2019年2月8日		ui专家,程序员C,彭	¥16,324.00
91			项目终验	1 个工作日	2019年2月6日	2019年2月6日	89	ui专家,程序员C,彭	¥2,761.00
92			结束采购	1 个工作日	2019年2月7日	2019年2月7日	91	ui专家,程序员C,彭	¥2,761.00
93			项目内部收尾	1 个工作日	2019年2月8日	2019年2月8日	92	ui专家,程序员C,彭	¥2,761.00







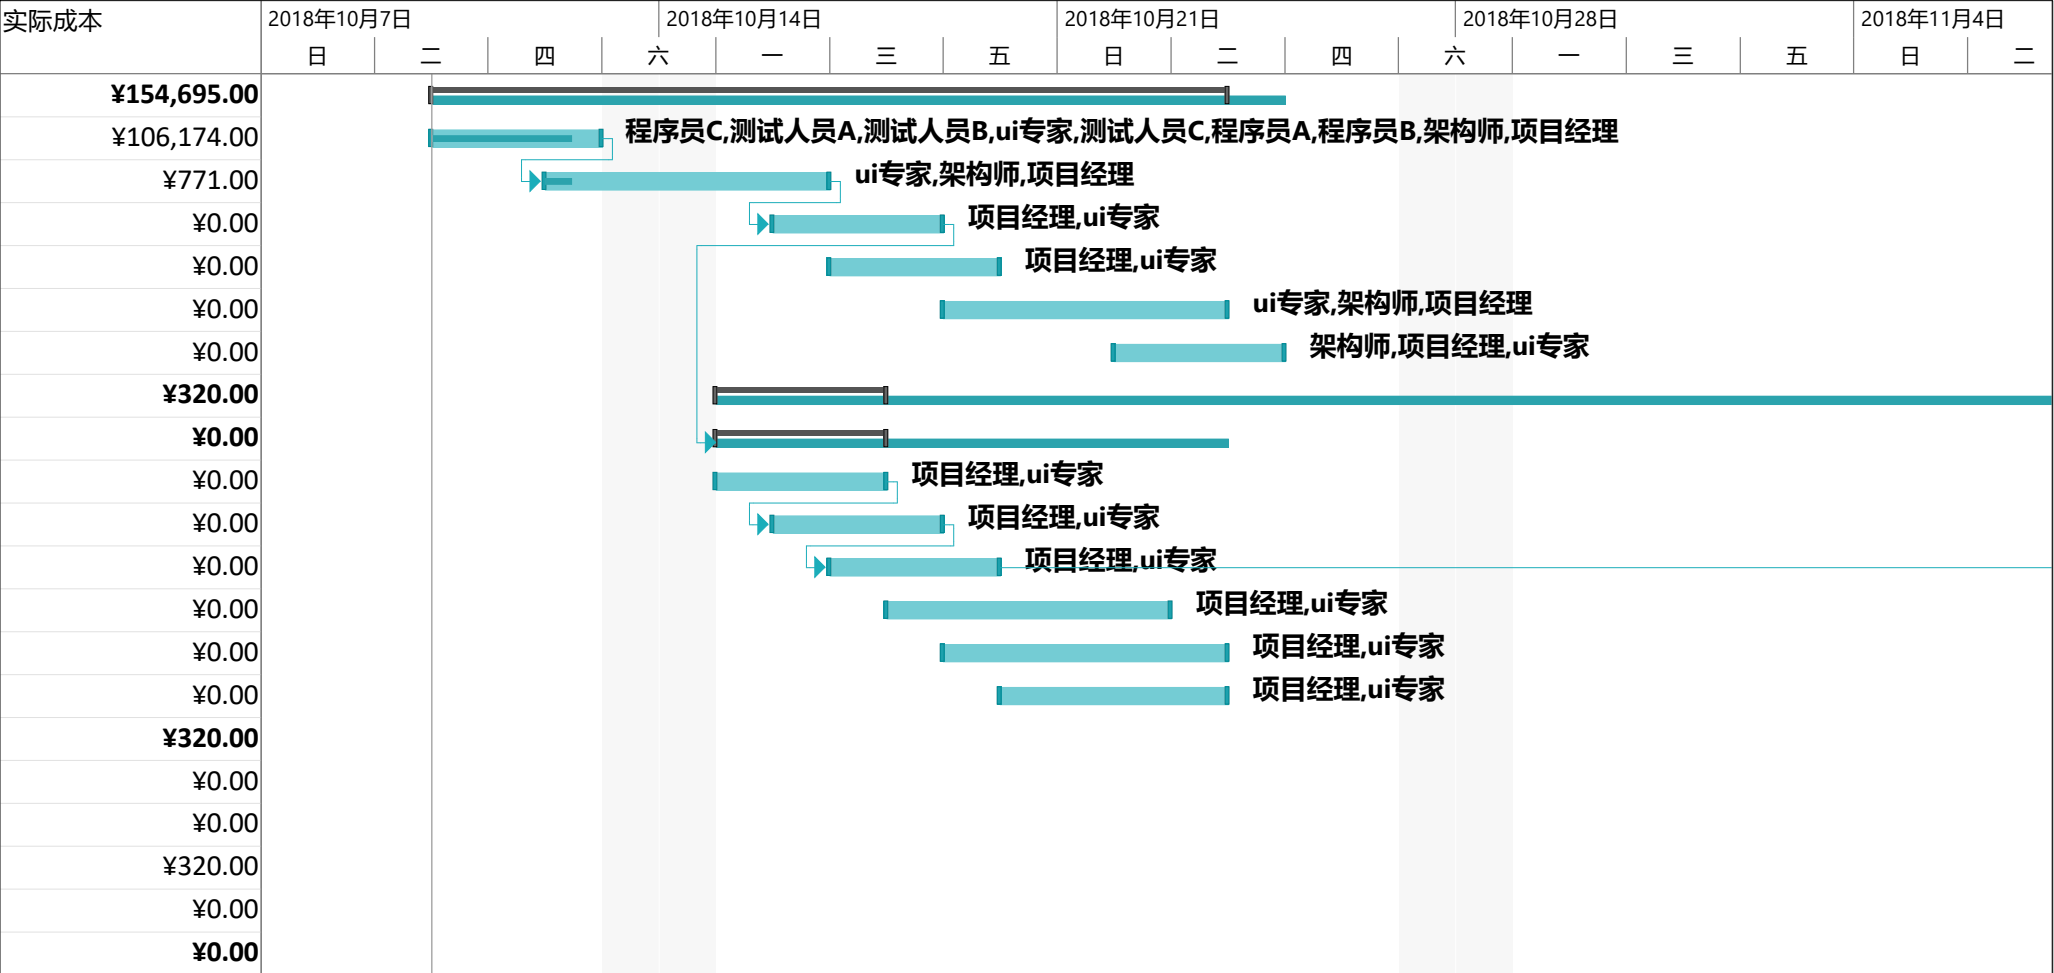












--


<div>Project: 简单项目计划</div> <div>Date: 2019年6月18日</div>	<div>Task</div> <div>Split</div> <div>Milestone</div> <div>Summary</div> <div>Project Summary</div> <div>Inactive Task</div> <div>Inactive Milestone</div> <div>Inactive Summary</div> <div>Manual Task</div> <div>Duration-only</div> <div>Manual Summary Rollup</div> <div>Manual Summary</div> <div>Start-only</div> <div>Finish-only</div> <div>External Tasks</div> <div>External Milestone</div> <div>Deadline</div> <div>Progress</div> <div>Manual Progress</div>
--	---




Project: 简单项目计划 Date: 2019年6月18日	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

[illegible]

Project: 简单项目计划 Date: 2019年6月18日	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

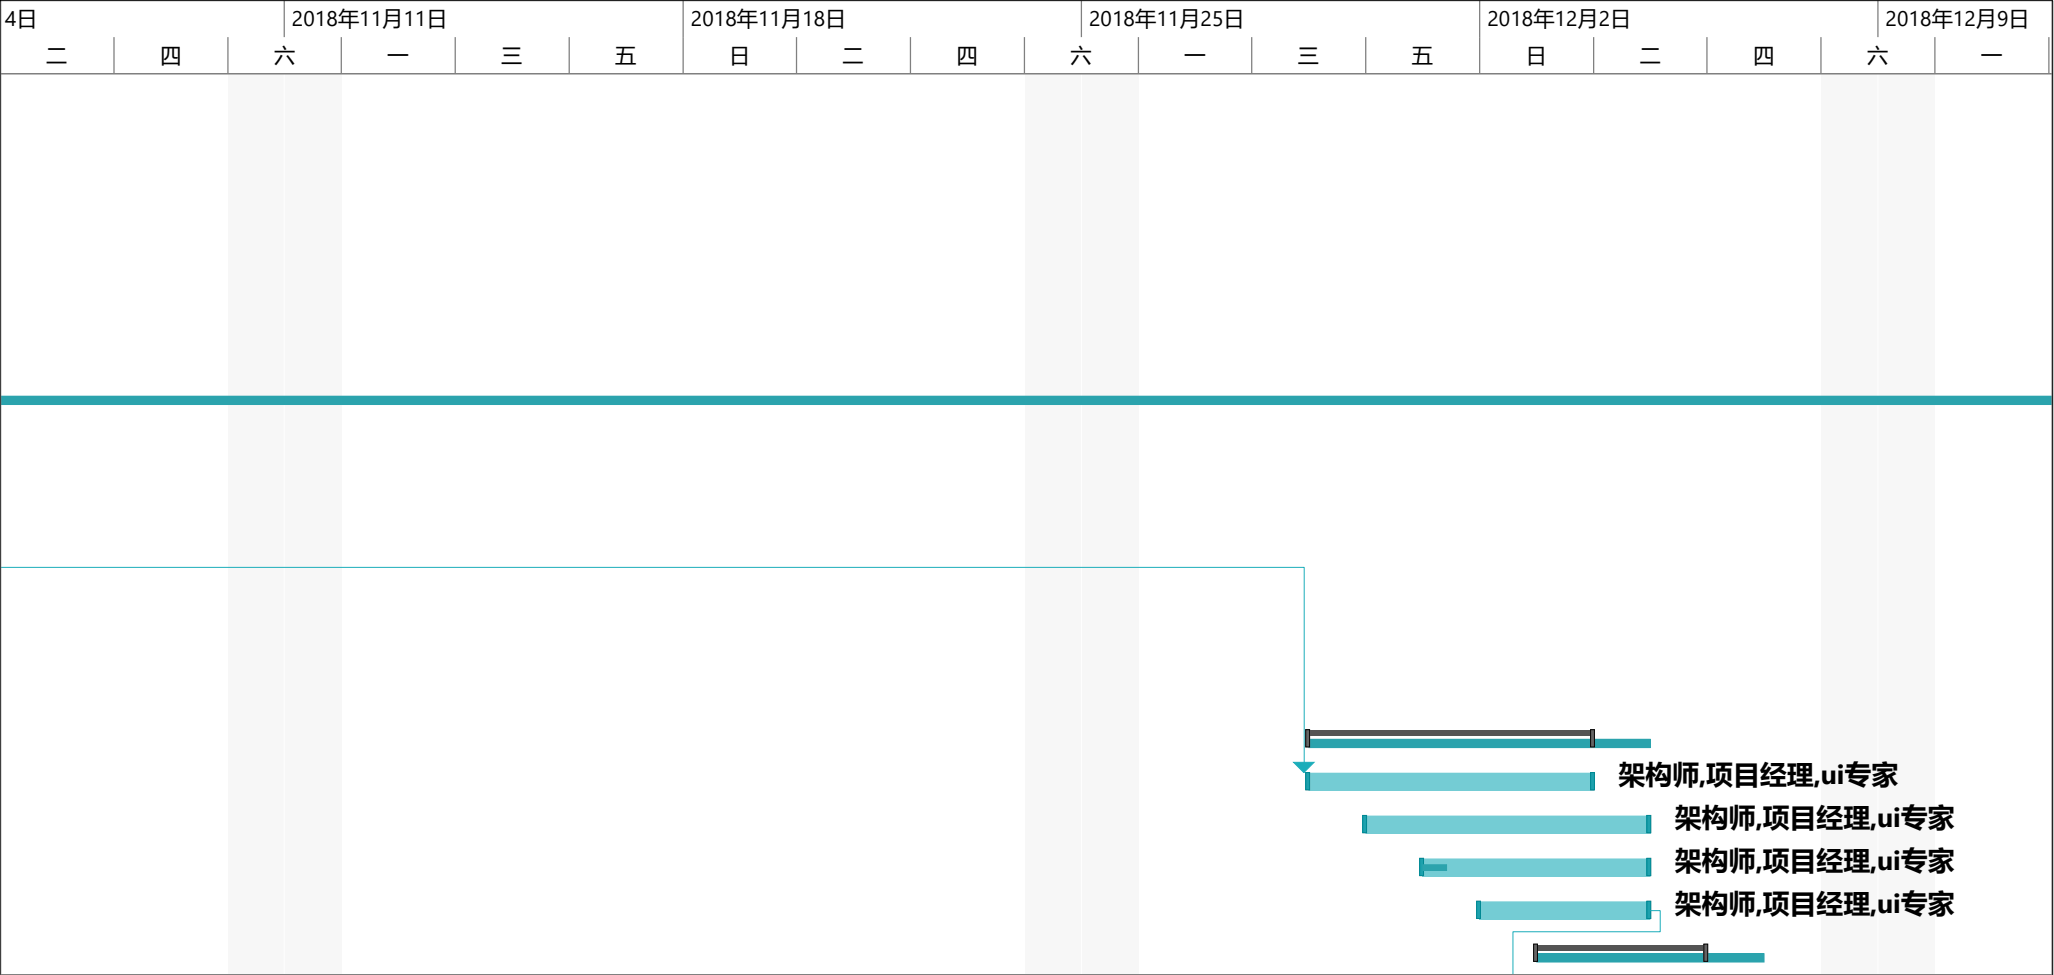


Project: 简单项目计划 Date: 2019年6月18日	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			

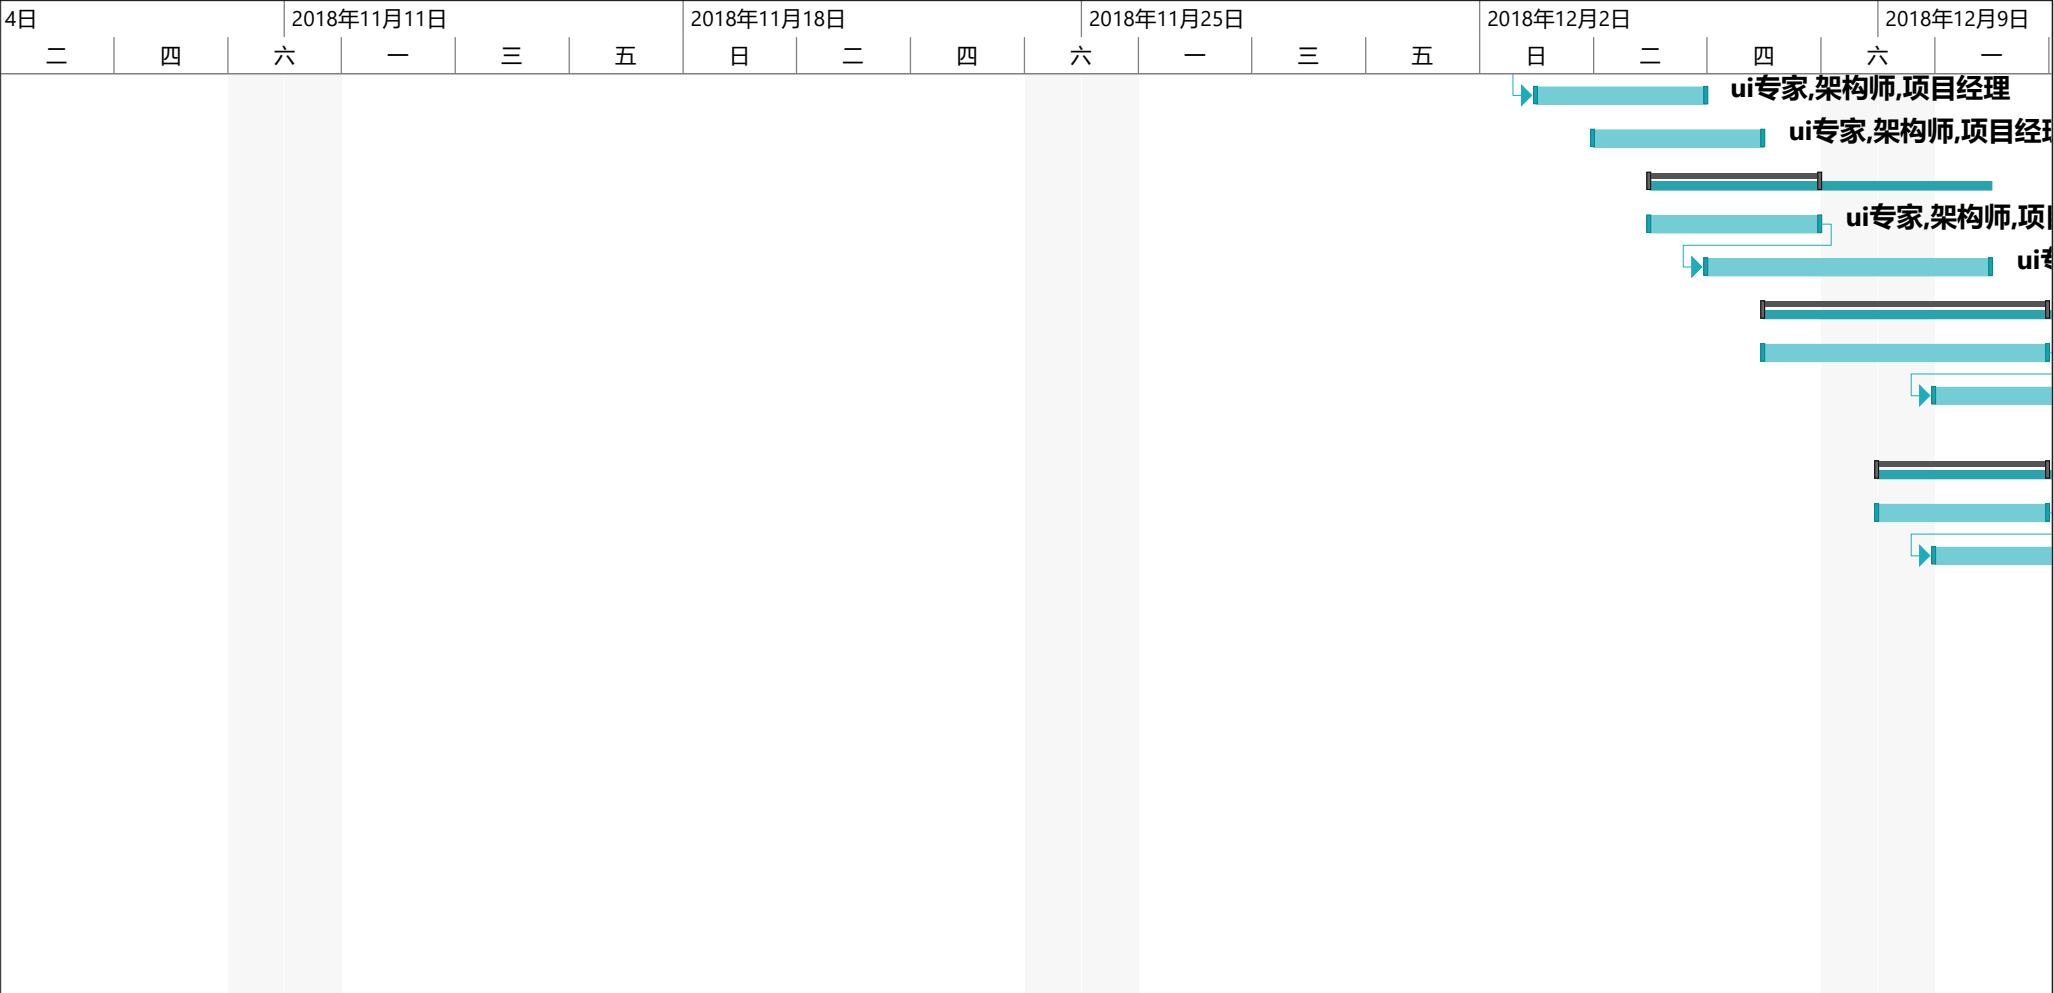

Project: 简单项目计划

Date: 2019年6月18日

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			

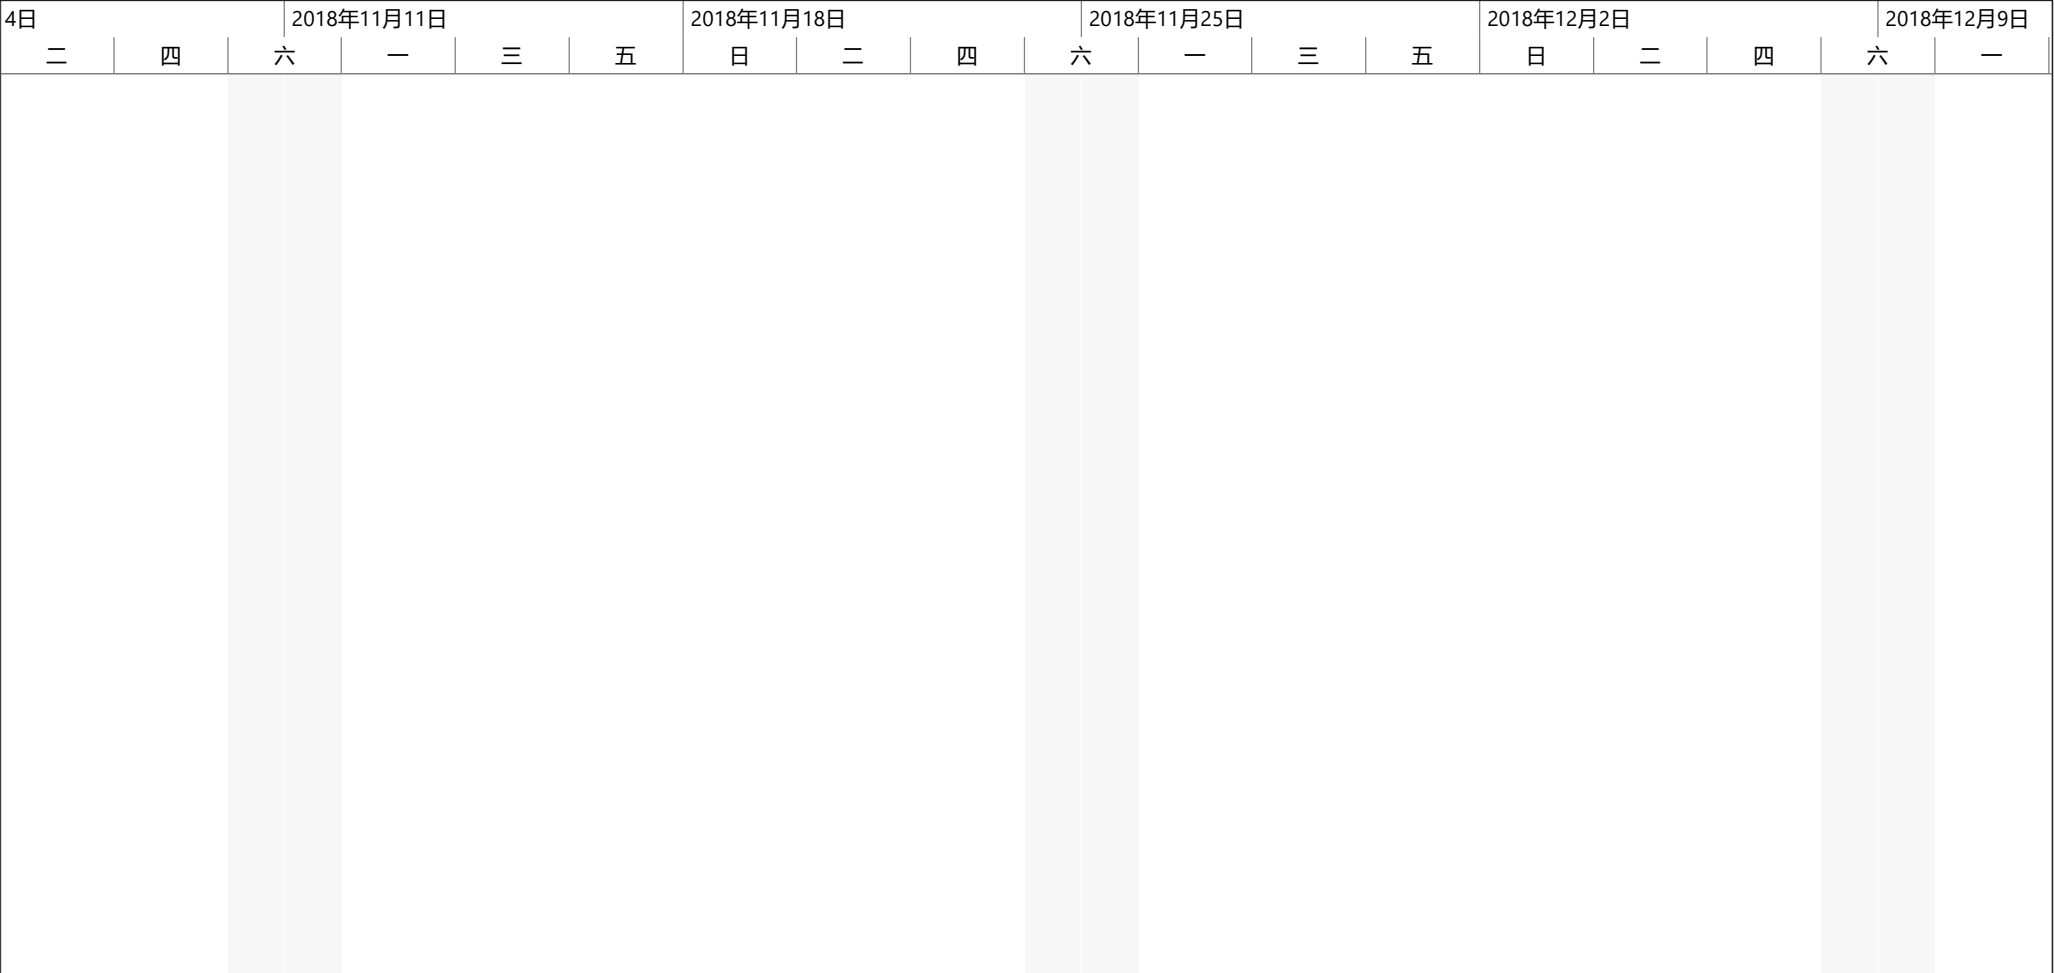

Project: 简单项目计划

Date: 2019年6月18日

Task

Split

Milestone

Summary

Project Summary

Inactive Task

Inactive Milestone

Inactive Summary

Manual Task

Duration-only

Manual Summary Rollup

Manual Summary

Start-only

Finish-only


External Tasks

External Milestone

Deadline

Progress


Manual Progress

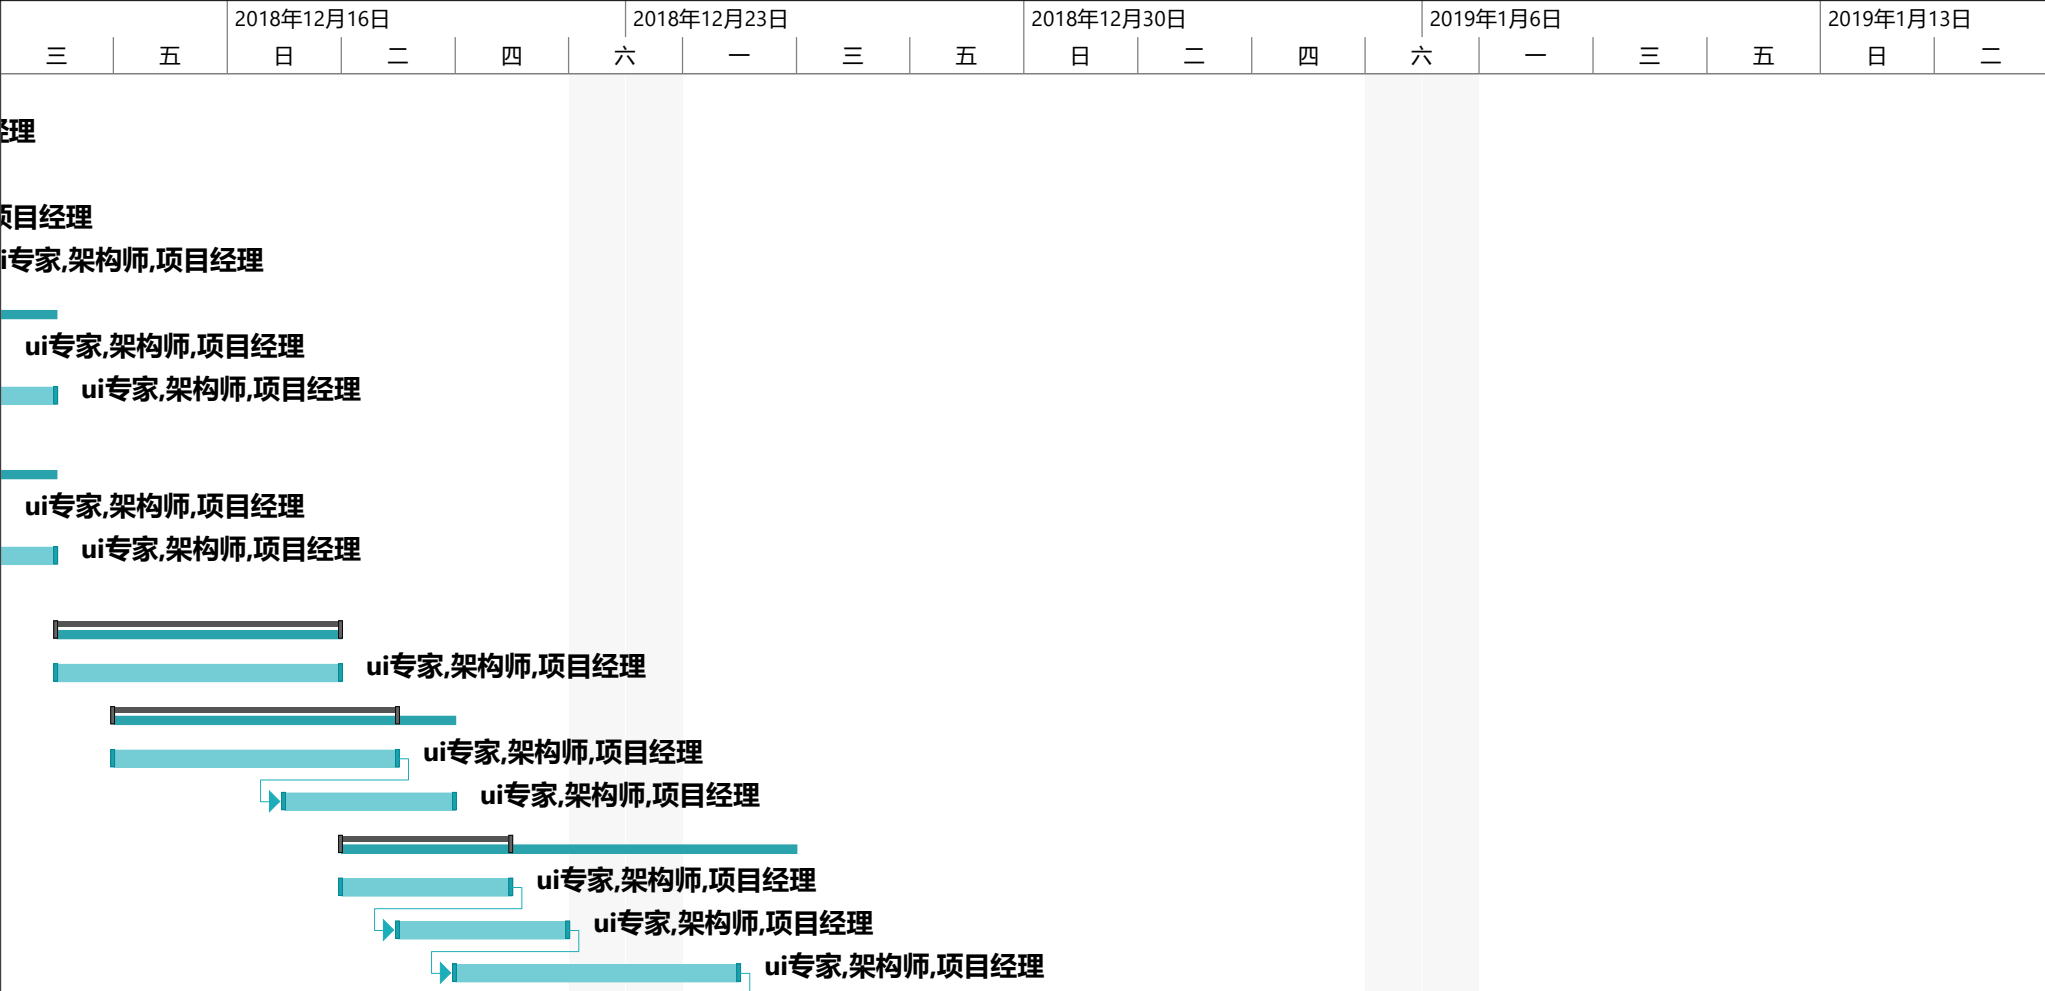








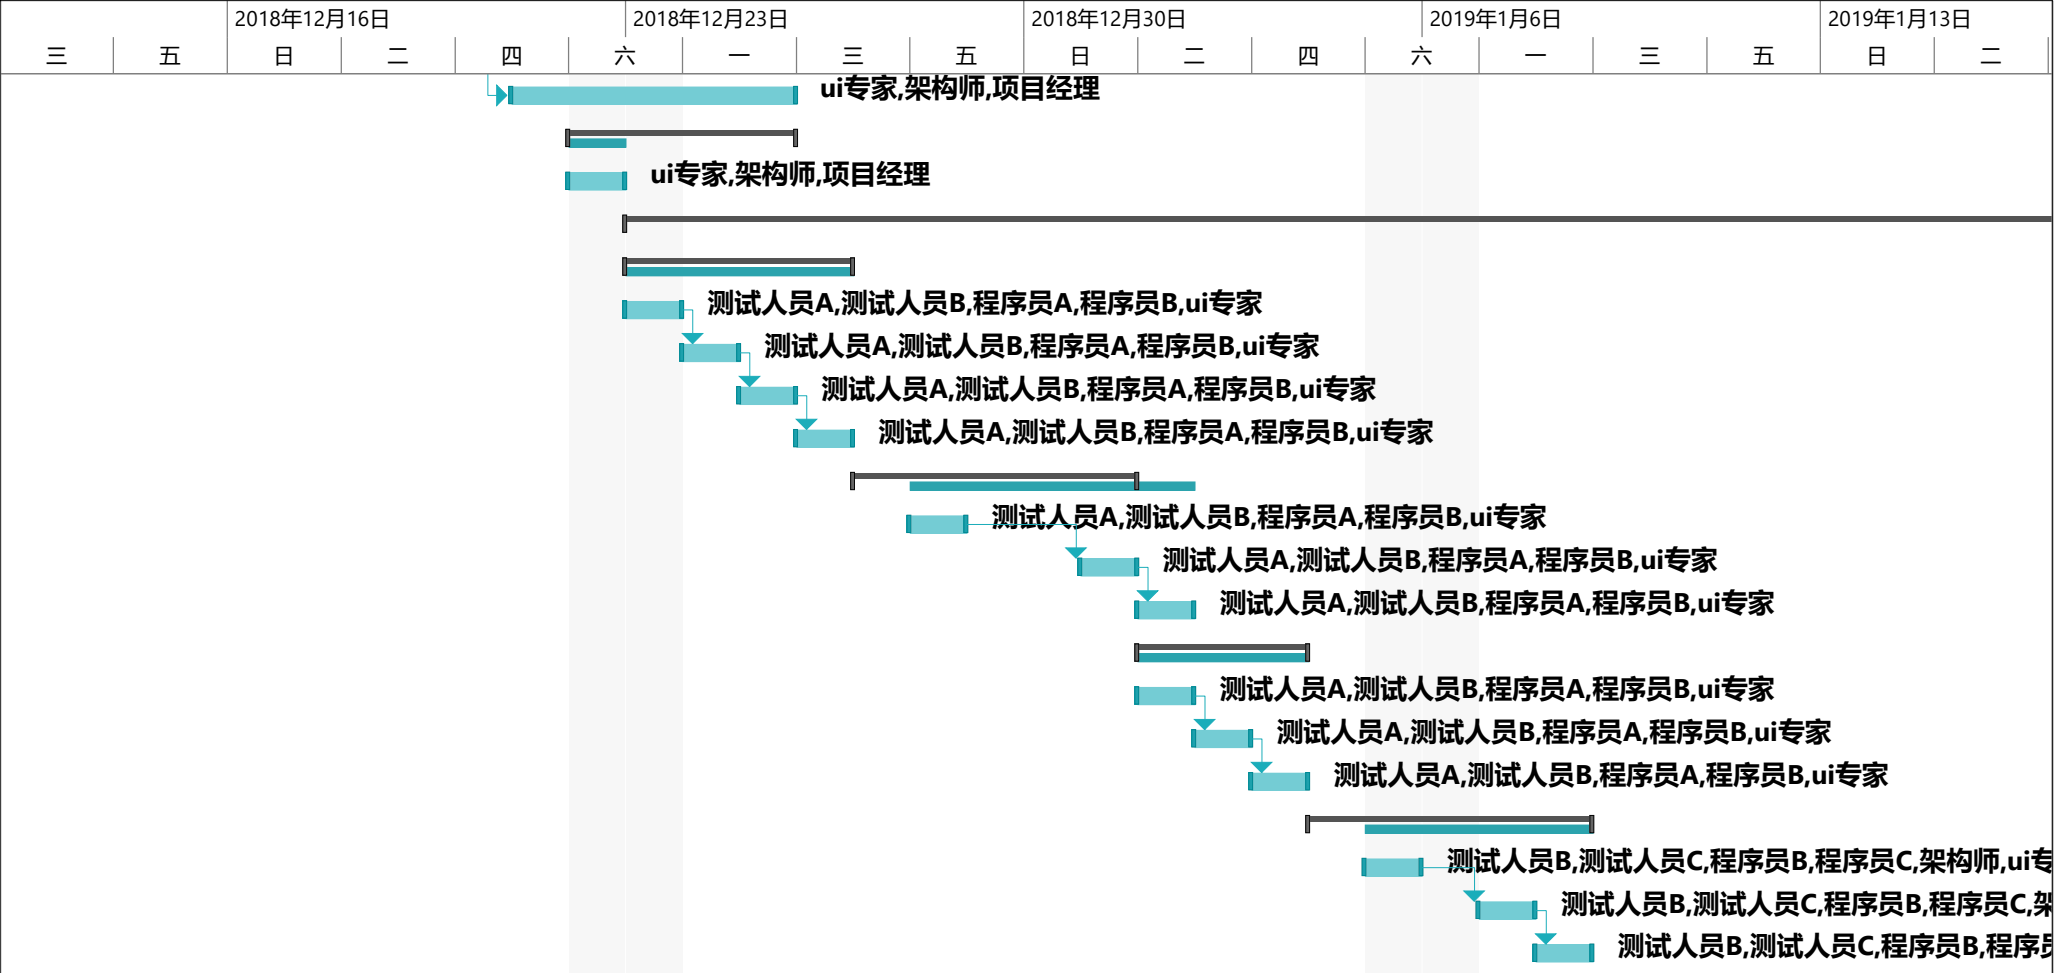











Project: 简单项目计划


Date: 2019年6月18日









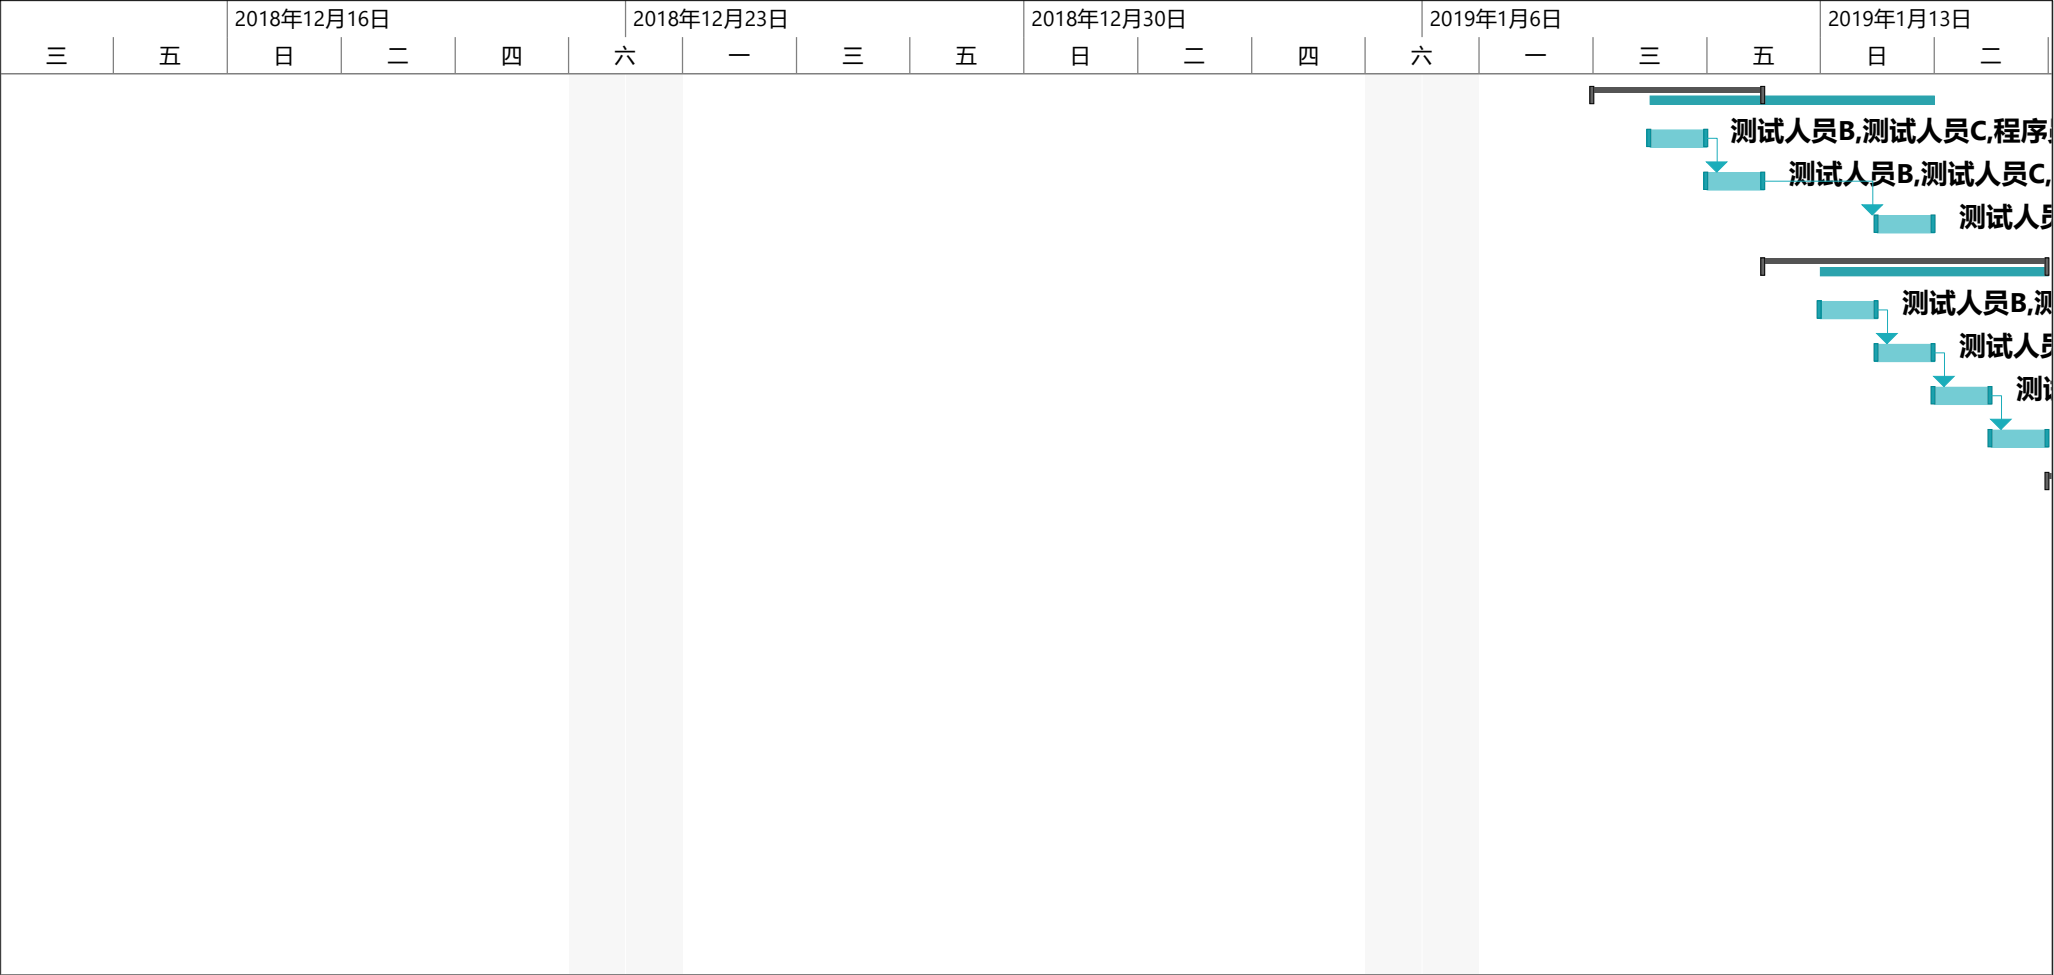










Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			



Project: 简单项目计划
Date: 2019年6月18日

Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			




Project: 简单项目计划 Date: 2019年6月18日	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only			


		2018年12月16日			2018年12月23日			2018年12月30日			2019年1月6日			2019年1月13日			
三	五	日	二	四	六	一	三	五	日	二	四	六	一	三	五	日	二


Project: 简单项目计划



Date: 2019年6月18日








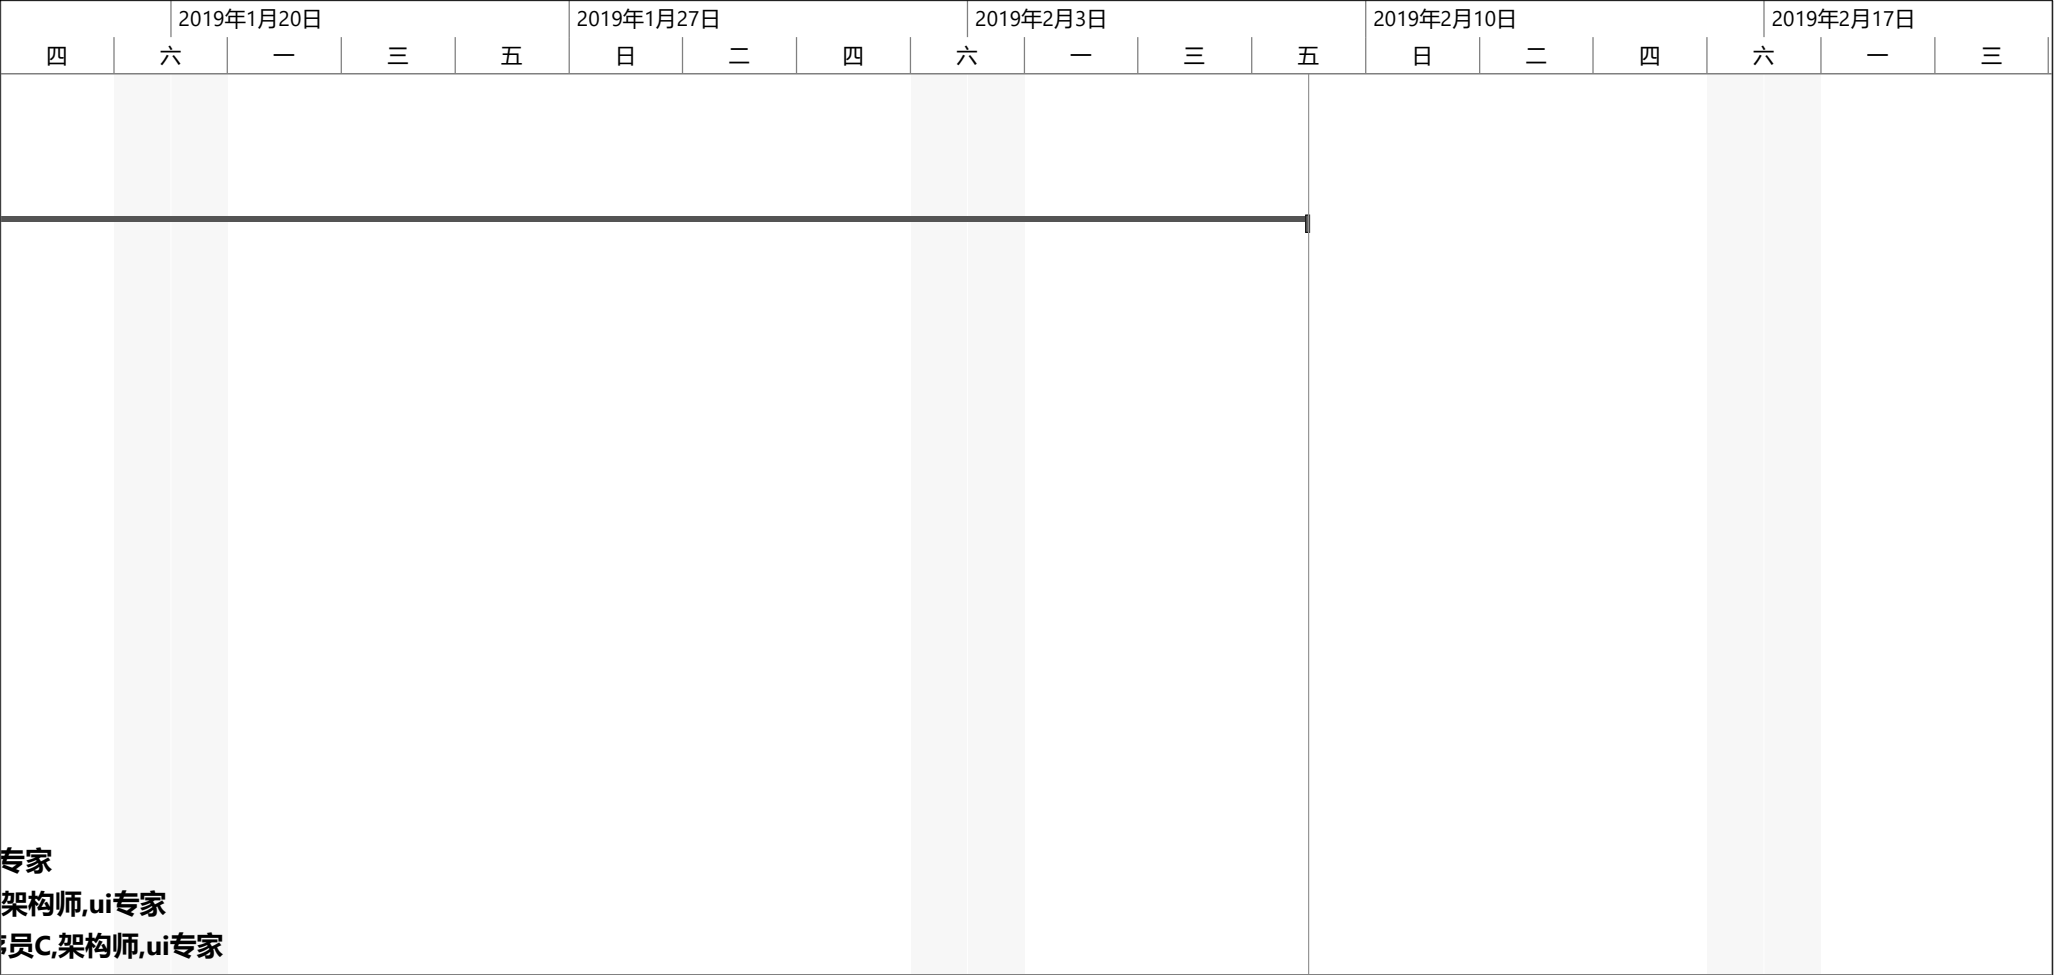

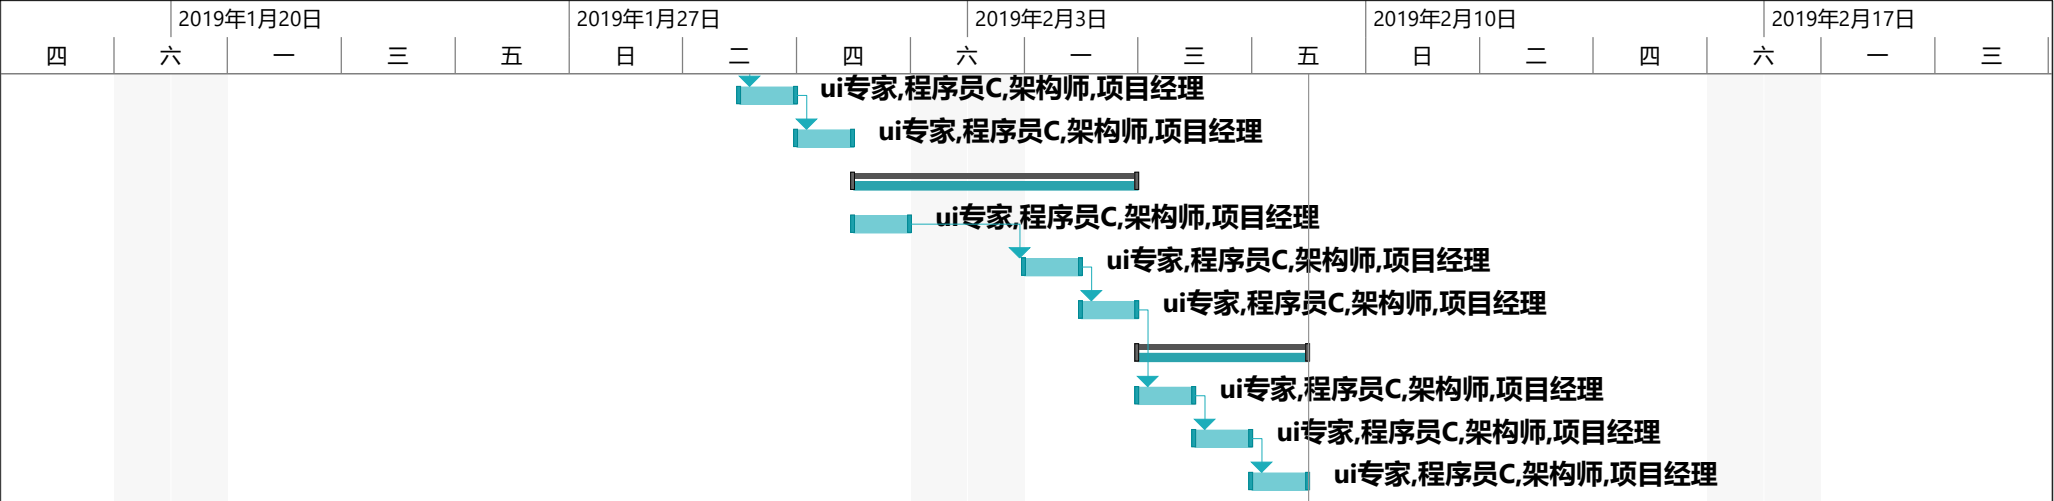








Task		Inactive Summary		External Tasks	
Split		Manual Task		External Milestone	
Milestone		Duration-only		Deadline	
Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
Inactive Task		Start-only			
Inactive Milestone		Finish-only			









Project: 简单项目计划 Date: 2019年6月18日	Task		Inactive Summary		External Tasks	
	Split		Manual Task		External Milestone	
	Milestone		Duration-only		Deadline	
	Summary		Manual Summary Rollup		Progress	
	Project Summary		Manual Summary		Manual Progress	
	Inactive Task		Start-only			
	Inactive Milestone		Finish-only	
