

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五	六	日	2019
1		项目启动	4 days	2019年3月23日	2019年3月28日						
2		组建核心团队	1 day	2019年3月23日	2019年3月25日		项目经理				
3		分析干系人利益	1 day	2019年3月25日	2019年3月26日	2	架构师, 项目经理				
4		制定项目功能	1 day	2019年3月26日	2019年3月27日	3	产品经理, 架构师, 利益干系人, 项				
5		里程碑计划	1 day	2019年3月26日	2019年3月27日	3	产品经理, 项目经理				
6		项目启动大会	1 day	2019年3月27日	2019年3月28日	4, 5	UI专家, 产品经理, 程序员1, 程序员				
7		项目规划	24 days	2019年3月28日	2019年4月30日	1					
8		范围规划	3 days	2019年3月28日	2019年4月2日						
9		制定需求规格说明书	1 day	2019年3月28日	2019年3月29日		产品经理, 项目经理				
10		范围说明书	1 day	2019年3月28日	2019年3月29日		产品经理, 项目经理				
11		界面设计	1 day	2019年3月29日	2019年4月1日	9, 10	UI专家, 项目经理				
12		设计详细说明书	1 day	2019年4月1日	2019年4月2日	9, 10, 11	产品经理, 架构师, 利益干系人				
13		创建WBS	1 day	2019年3月29日	2019年4月1日	10	项目经理				
14		形成范围基准	1 day	2019年4月1日	2019年4月2日	13	产品经理, 项目经理				
15		成本规划	1 day	2019年4月2日	2019年4月3日						
16		预算项目成本	1 day	2019年4月2日	2019年4月3日	14	项目经理				
17		时间规划	3 days	2019年4月3日	2019年4月8日						
18		模块时间规划	1 day	2019年4月3日	2019年4月4日	16	程序员1, 项目经理				
19		排列工作顺序	1 day	2019年4月4日	2019年4月5日	18	程序员2, 项目经理				
20		制定进度计划	1 day	2019年4月5日	2019年4月8日	19	程序员3, 项目经理				
21		质量规划	2 days	2019年4月8日	2019年4月10日						
22		指定测试计划	1 day	2019年4月8日	2019年4月9日	20	项目经理, 测试专家				
23		制定测试用例	1 day	2019年4月9日	2019年4月10日	22	测试专家				
24		人力资源规划	2 days	2019年4月10日	2019年4月12日						
25		制定人员任务分配计划	1 day	2019年4月10日	2019年4月11日	19	架构师, 项目经理				
26		资源环境统一计划	1 day	2019年4月11日	2019年4月12日	25	程序员1, 程序员2, 程序员3, 架构师				
27		沟通规划	1 day?	2019年4月12日	2019年4月15日						
28		制定沟通管理计划	1 day	2019年4月12日	2019年4月15日	26	程序员1, 程序员2, 程序员3, 架构师				
29		采购规划	3 days	2019年4月15日	2019年4月18日						
30		制定采购计划	1 day	2019年4月15日	2019年4月16日	28	程序员1, 程序员3				
31		自制外购分析	2 days	2019年4月16日	2019年4月18日	30	程序员2, 程序员4				
32		规划风险	6 days	2019年4月18日	2019年4月26日						
33		识别风险	2 days	2019年4月18日	2019年4月22日	31	产品经理, 利益干系人, 项目经理				

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

仅开始时间

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	五	六	2019
34		分析风险	2 days	2019年4月22日	2019年4月24日	33	产品经理, 项目经理			
35		制定风险登记册	2 days	2019年4月24日	2019年4月26日	34	程序员4, 项目经理			
36		整合规划	2 days	2019年4月26日	2019年4月30日					
37		制定整合顺序计划	2 days	2019年4月26日	2019年4月30日	35	程序员1, 程序员2, 程序员3, 程序员4			
38		项目开发	25 days	2019年4月30日	2019年6月4日					
39		组建项目开发团队	2 days	2019年4月30日	2019年5月2日	37	架构师, 项目经理, 程序员1, 程序员2			
40		项目执行	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37				
41		课程模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37	程序员1, 程序员2			
42		课程索引	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员1, 程序员2			
43		课程分类	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员1, 程序员2			
44		课程详细介绍	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员1, 程序员2			
45		课程视频播放	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员1, 程序员2			
46		课程评价	2 days	2019年5月14日	2019年5月16日	45	程序员1, 程序员2			
47		咨询模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37	程序员3, 程序员4			
48		咨询索引	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员3, 程序员4			
49		咨询师介绍	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员3, 程序员4			
50		咨询师预约	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员3, 程序员4			
51		咨询方式分类及实现	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员3, 程序员4			
52		付款功能	2 days	2019年5月14日	2019年5月16日	51	程序员3, 程序员4			
53		及时倾听模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37	程序员5, 程序员6			
54		倾听索引	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员5, 程序员6			
55		倾听师介绍	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员5, 程序员6			
56		预约	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员5, 程序员6			
57		倾听方式分类	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员5, 程序员6			
58		付款功能	2 days	2019年5月14日	2019年5月16日	57	程序员5, 程序员6			
59		阅读模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37	程序员7			
60		文章索引	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员7			
61		文章分类	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员7			
62		文章内容展示	8 days	2019年5月2日	2019年5月14日	37	程序员7			
63		文章评价	2 days	2019年5月14日	2019年5月16日	62	程序员7			
64		个人中心模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37	程序员8, 程序员9			
65		用户模块	10 days	2019年5月2日	2019年5月16日	37	程序员8			

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间

仅完成时间

期限

进度

手动进度

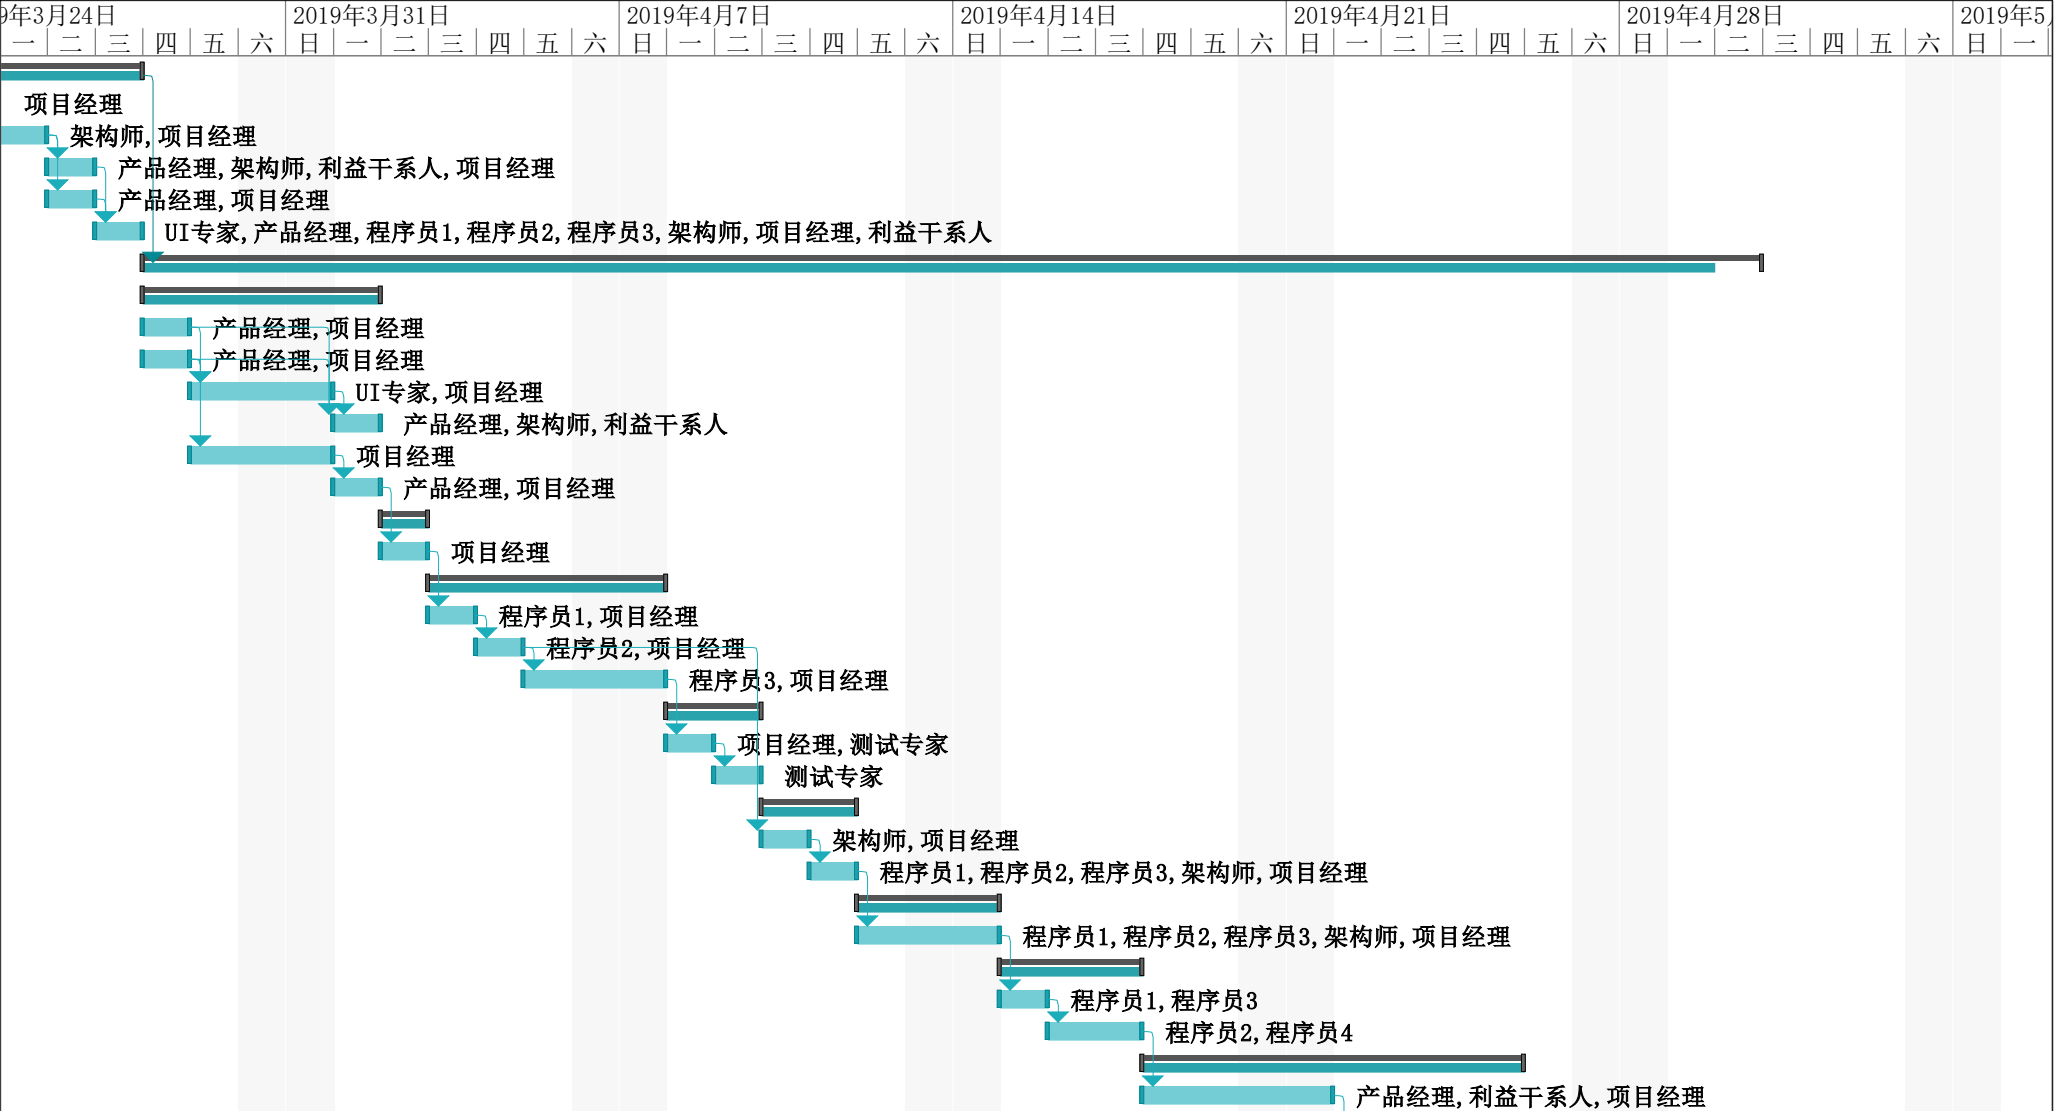

项目：msproj11

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间

仅完成时间


期限

进度


手动进度

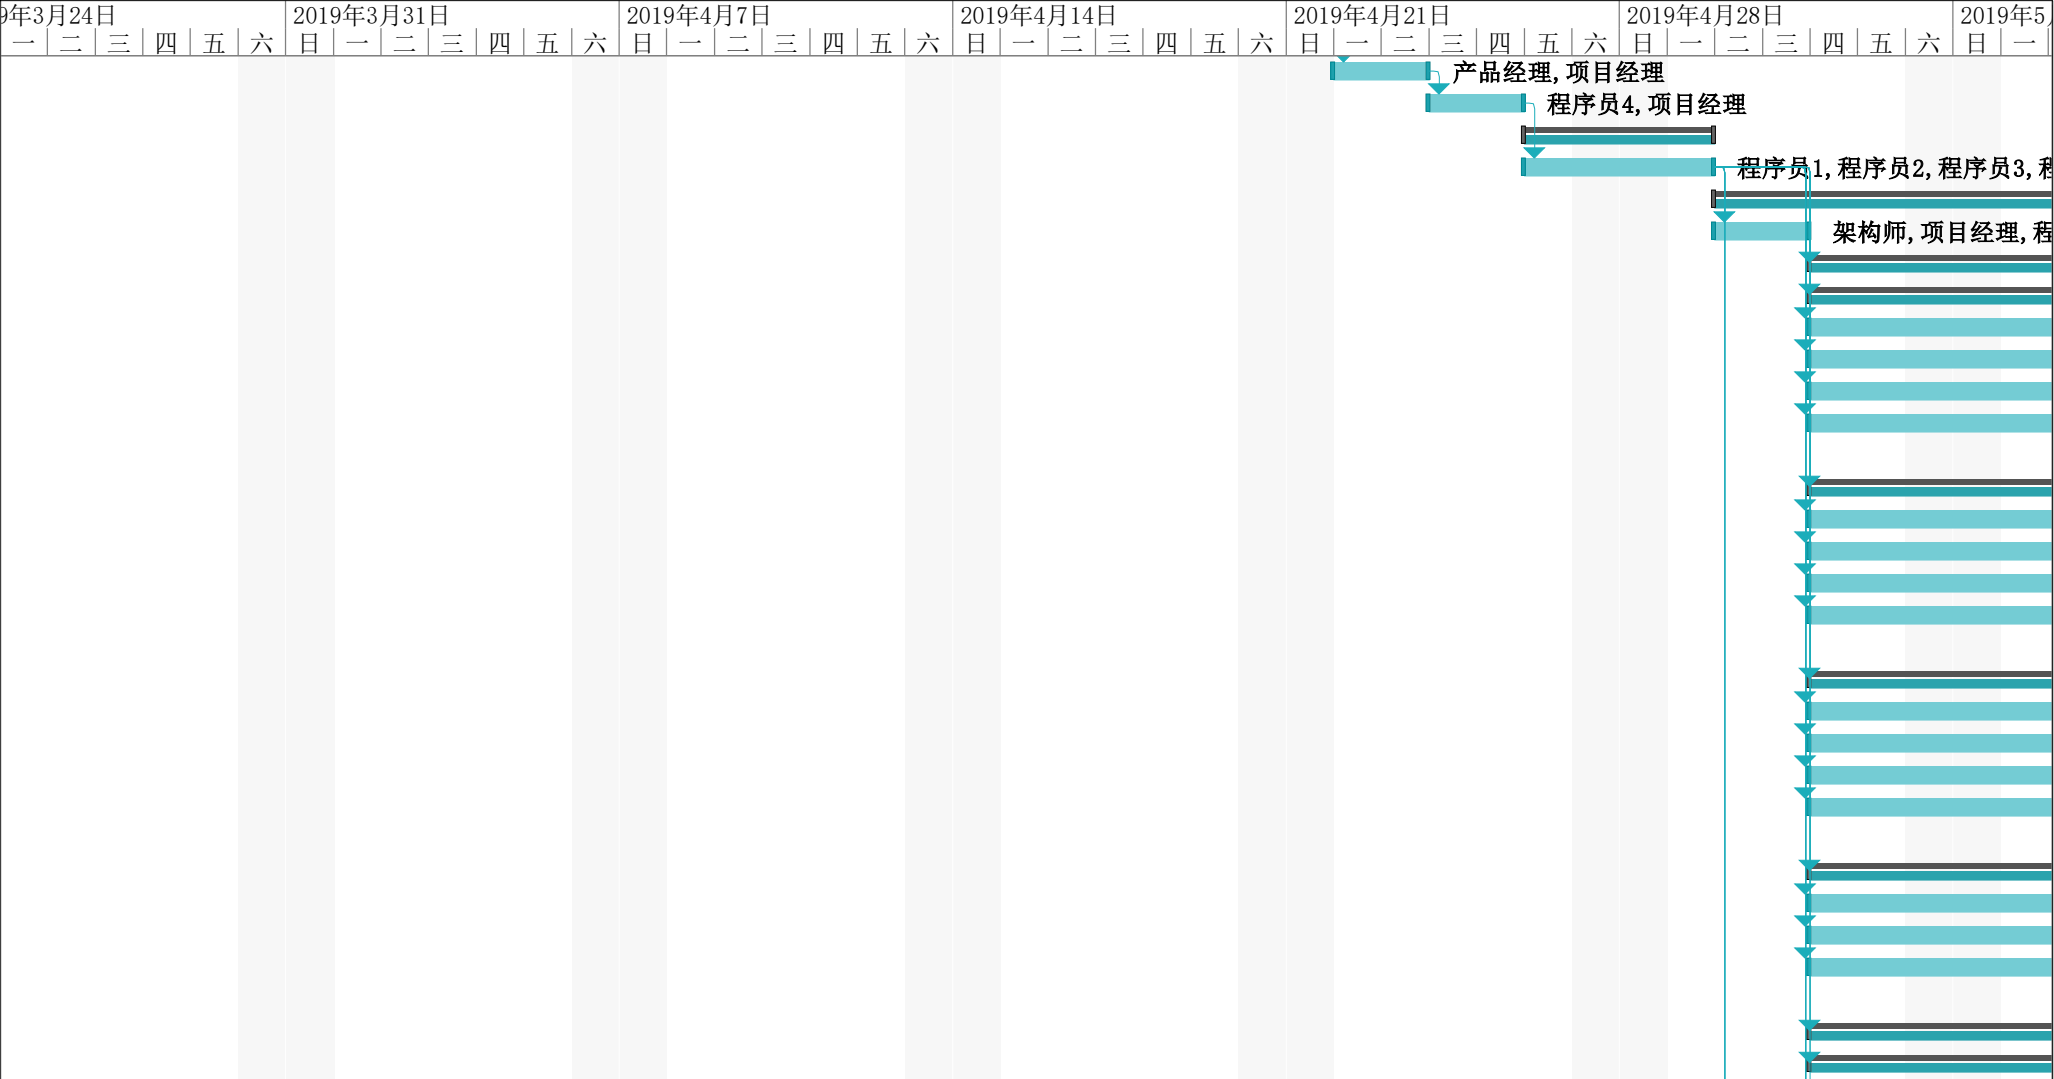

项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

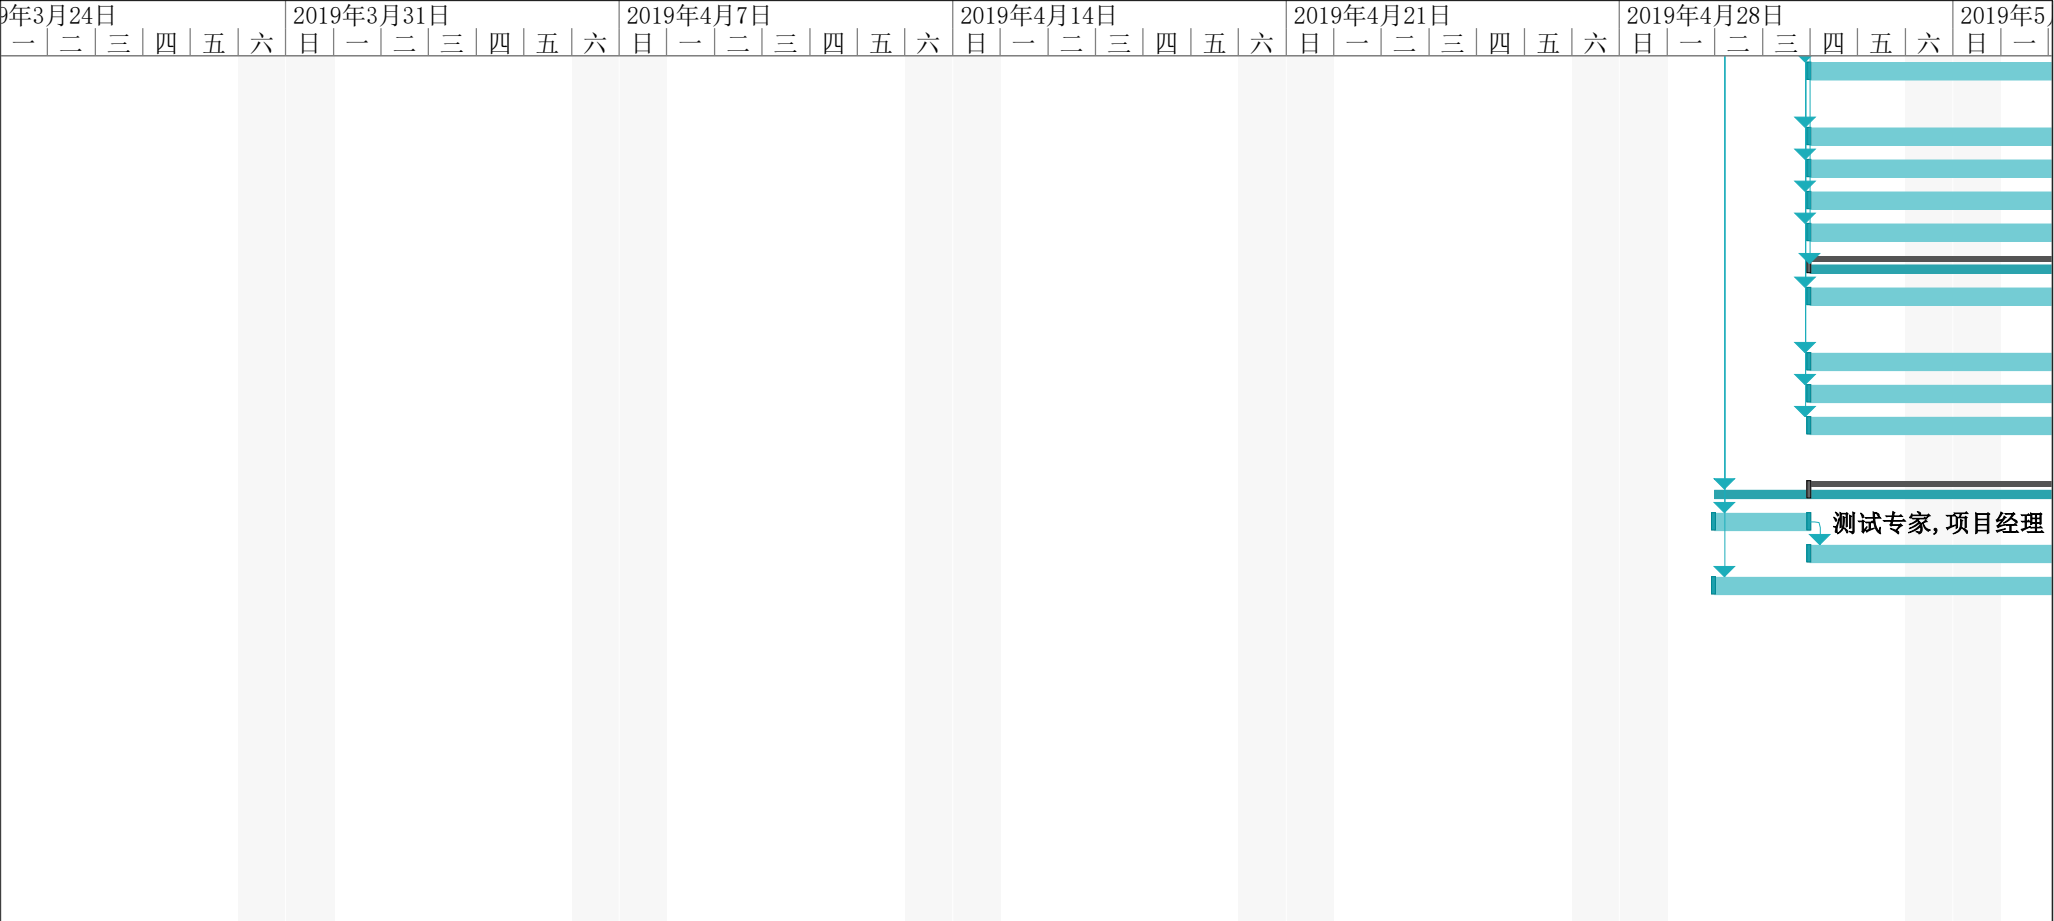

项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			

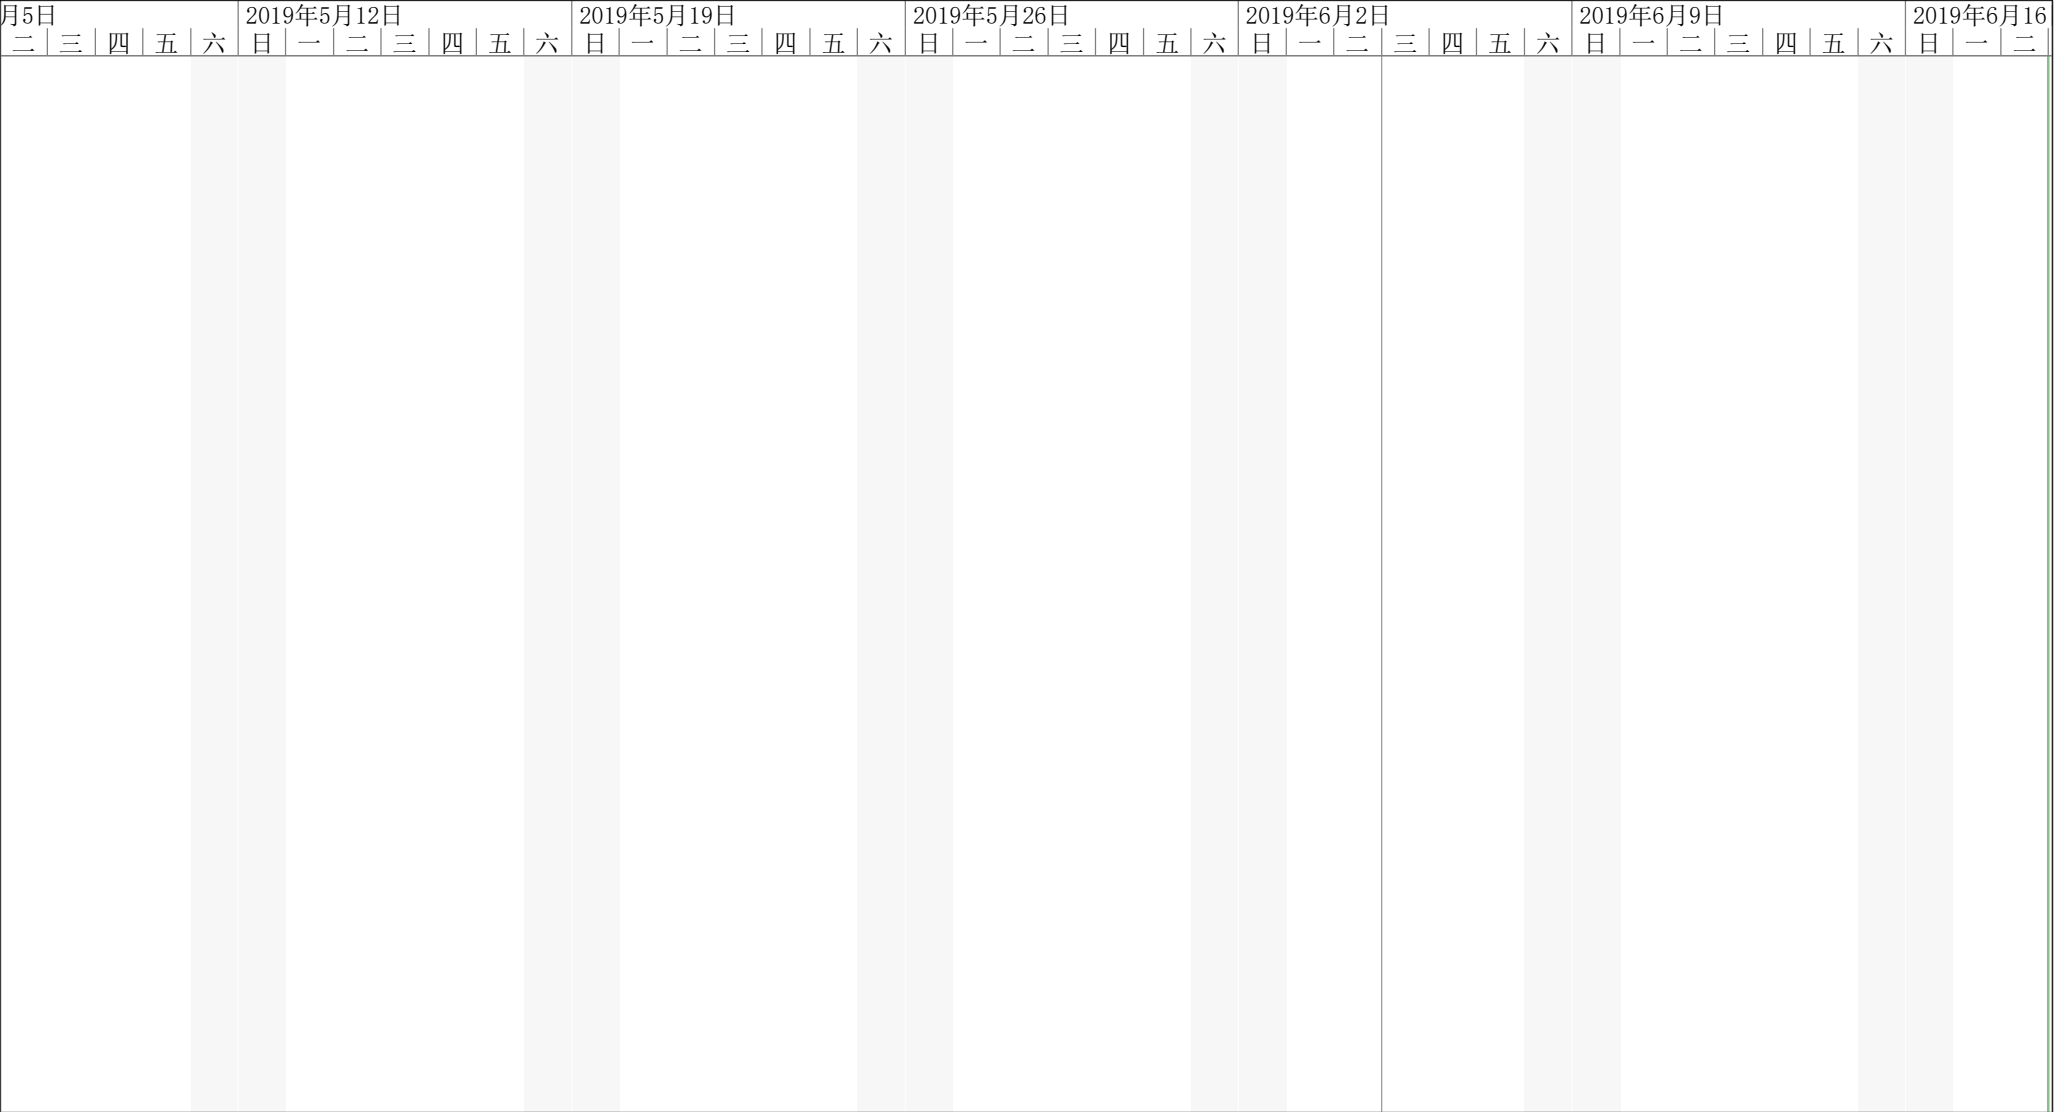

项目：msproj11
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

外部任务

外部里程碑

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要


仅开始时间







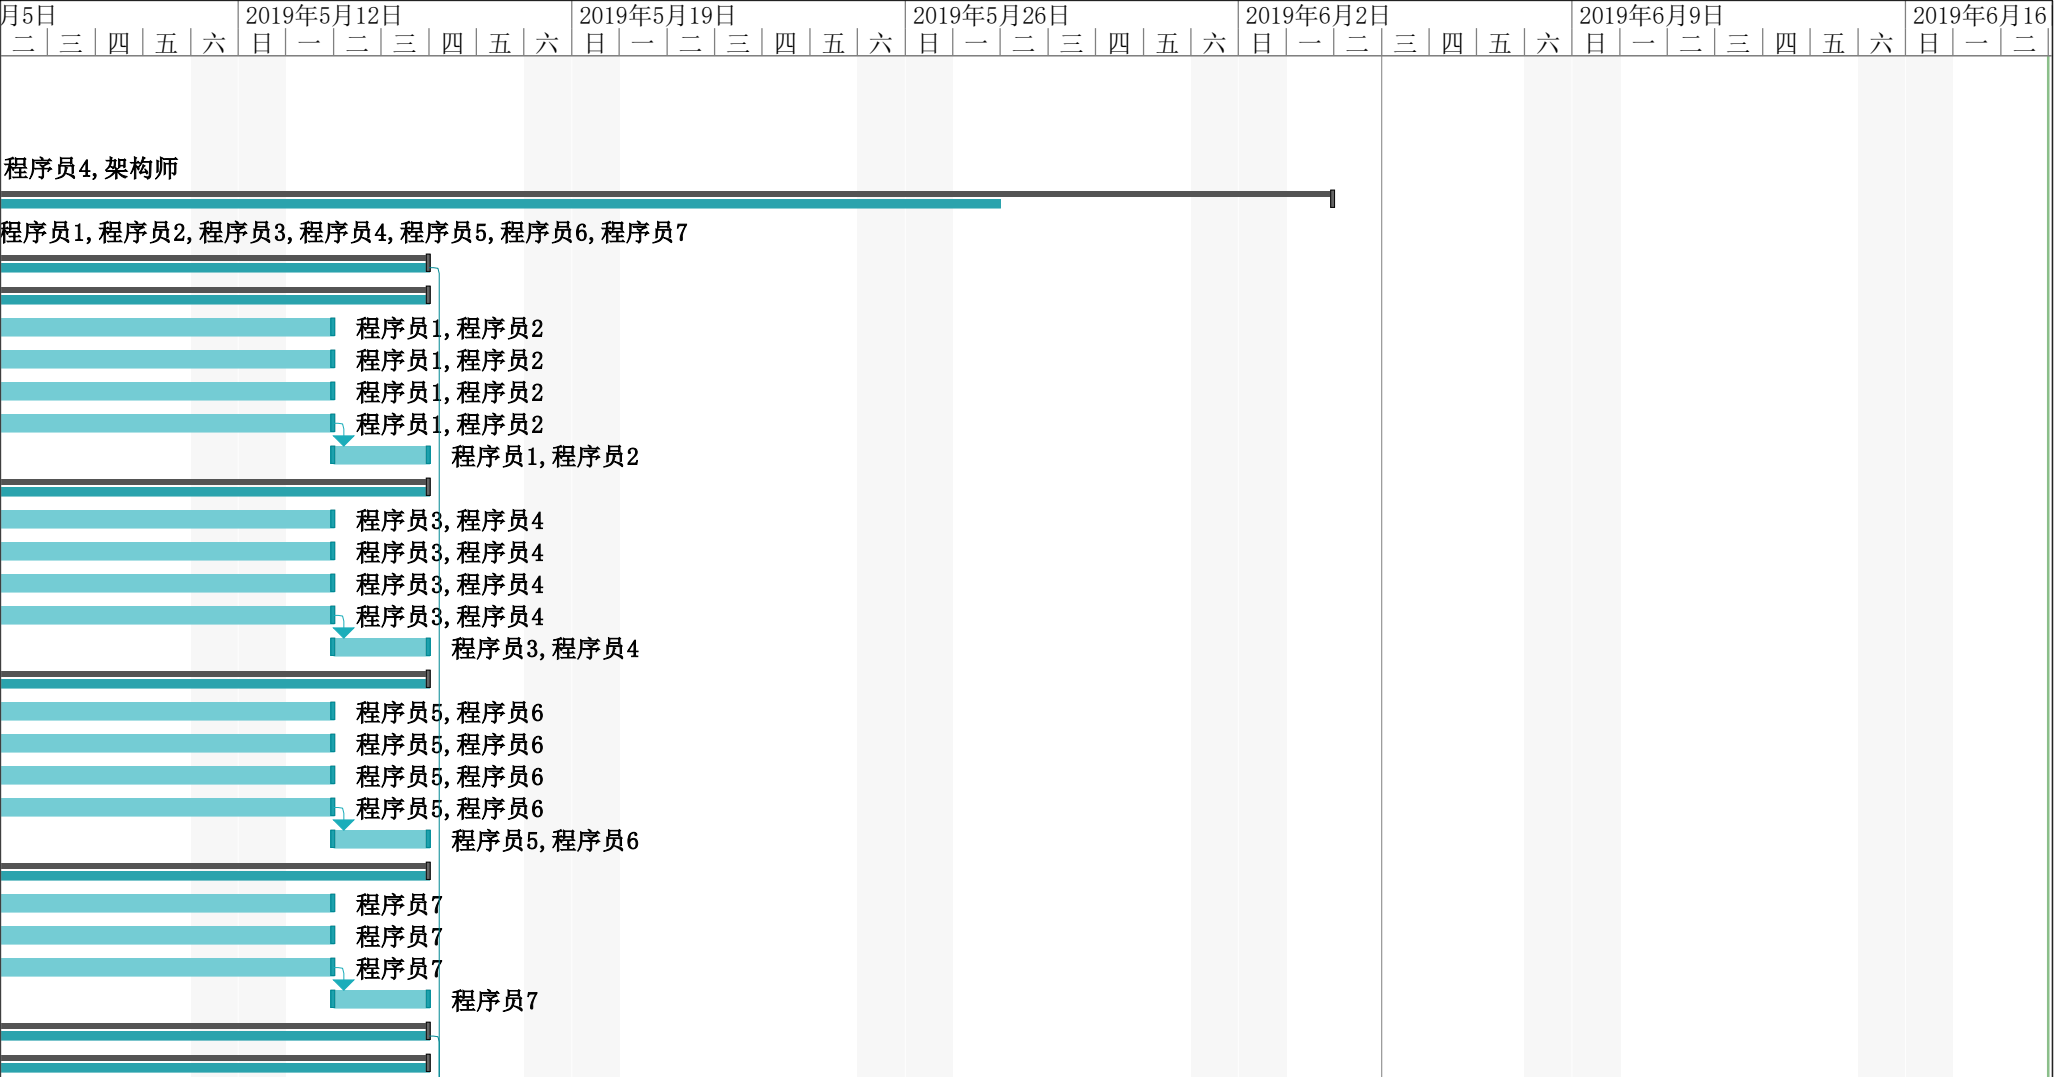

仅完成时间

期限

进度

手动进度



项目：msproj11 日期：2019年6月19日	任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
	拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
	里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
	摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
	项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			



项目：msproj11 日期：2019年6月19日		任务		外部任务		手动任务		仅完成时间	
		拆分		外部里程碑		仅工期		期限	
		里程碑		非活动任务		手动摘要总成		进度	
		摘要		非活动里程碑		手动摘要		手动进度	
		项目摘要		非活动摘要		仅开始时间			
