




















标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置	资源名称	2019 一	三月 二	25 三	四	五	六	日	20 一
1			启动	3 个工作日	2019年3月29日	2019年4月2日										
2			任命项目经理	2 个工作日	2019年3月29日	2019年4月1日		项目经理, UI设计师								
3			组建核心团队	2.5 个工作日	2019年3月29日	2019年4月2日	2	项目经理								
4			制定时间计划及里程碑	0.5 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	3	项目经理								
5			分析干系人	0 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	4	架构师, 项目协调员								
6			确定项目发起人	1 个工作日	2019年3月29日	2019年3月29日	5	程序员4, 程序员3, 测试员								
7			制定项目章程	1 个工作日	2019年4月1日	2019年4月1日	6	UI设计师, 测试员								
8			项目启动大会	1 个工作日	2019年4月2日	2019年4月2日	7	项目经理								
9			规划	18 个工作日	2019年4月4日	2019年4月29日										
10			规划范围	3 个工作日	2019年4月4日	2019年4月8日										
11			制定需求说明书	4 个工作日	2019年3月26日	2019年3月29日		项目经理								
12			界面设计	2 个工作日	2019年4月1日	2019年4月2日	11	UI设计师, 项目协调员								
13			详细设计说明书	4 个工作日	2019年4月2日	2019年4月5日	12	测试员								
14			范围说明书	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	13	项目经理								
15			创建WBS	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	14	项目经理								
16			形成范围基准	2 个工作日	2019年4月7日	2019年4月8日	15	项目经理								
17			规划时间	6 个工作日	2019年4月6日	2019年4月12日										
18			估算资源	1 个工作日	2019年4月5日	2019年4月5日	8	程序员1, 项目协调员								
19			估算持续时间	3 个工作日	2019年4月8日	2019年4月10日	18	架构师, 项目协调员								
20			制定进度计划	3 个工作日	2019年4月9日	2019年4月11日	19	UI设计师, 程序员3								
21			排列工作包顺序	1 个工作日	2019年4月12日	2019年4月12日	20	程序员1, 程序员2								
22			规划成本	6 个工作日	2019年4月14日	2019年4月19日										
23			项目成本估算	11 个工作日	2019年4月4日	2019年4月18日	21	程序员2, 程序员1								
24			项目预算	2 个工作日	2019年4月18日	2019年4月19日	23	测试员, 程序员2								
25			规划质量	4 个工作日	2019年4月23日	2019年4月26日										
26			制定测试计划	4 个工作日	2019年4月19日	2019年4月24日	24	测试员, 程序员3								
27			制定测试用例	1 个工作日	2019年4月26日	2019年4月26日	26	测试员, 程序员3								
28			规划人力资源	6 个工作日	2019年4月20日	2019年4月26日										
29			制定人力资源计划	3 个工作日	2019年4月20日	2019年4月23日	27	程序员4, 架构师								
30			制定人员配备管理计划	3 个工作日	2019年4月24日	2019年4月26日	29	UI设计师, 测试员, 程序员3								
31			规划沟通	5 个工作日	2019年4月23日	2019年4月27日										
32			制定沟通管理计划	5 个工作日	2019年4月23日	2019年4月27日	30									




















项目：明心心理咨询WBS  
日期：2019年4月4日


任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置	资源名称	2019 一	三月 二	25 三	四	五	六	日	20 一
33			规划采购	7 个工作日	2019年4月20日	2019年4月27日										
34			自制外购分析	5 个工作日	2019年4月21日	2019年4月25日	32	程序员2, 程序								
35			制定采购文件	2 个工作日	2019年4月26日	2019年4月27日	34	程序员2, 程序								
36			规划风险	3 个工作日	2019年4月25日	2019年4月28日										
37			识别风险	1 个工作日	2019年4月28日	2019年4月28日	35	程序员1, 程序								
38			风险分析	1 个工作日	2019年4月28日	2019年4月28日	37	程序员1, 程序								
39			制定风险分析册	1 个工作日	2019年4月28日	2019年4月28日	38	测试员, 程序								
40			规划整合	1 个工作日	2019年4月29日	2019年4月29日	39	UI设计师, 架构								
41			执行与监控	38 个工作日	2019年5月1日	2019年6月21日										
42			组建项目团队	3 个工作日	2019年4月30日	2019年5月3日	40	项目经理								
43			项目执行	27 个工作日	2019年5月3日	2019年6月10日										
44			首页	3 个工作日	2019年5月30日	2019年6月2日	42	程序员1, 程序								
45			咨询模块	22 个工作日	2019年5月4日	2019年6月1日										
46			咨询师介绍	5 个工作日	2019年5月4日	2019年5月9日	40	程序员1								
47			咨询师筛选	28 个工作日	2019年4月5日	2019年5月15日	46	程序员1								
48			咨询预约	10 个工作日	2019年5月16日	2019年5月29日	47	程序员1								
49			及时倾听模块	16 个工作日	2019年5月9日	2019年5月30日										
50			倾听师筛选	5 个工作日	2019年5月9日	2019年5月15日	48	程序员2								
51			倾听师介绍	4 个工作日	2019年5月16日	2019年5月21日	50	程序员2								
52			预约	2 个工作日	2019年5月22日	2019年5月23日	51	程序员2								
53			付费	4 个工作日	2019年5月24日	2019年5月29日	52	程序员2								
54			课程模块	17 个工作日	2019年5月8日	2019年5月30日										
55			课程筛选	3 个工作日	2019年5月8日	2019年5月10日	53	程序员3								
56			课程详情	4 个工作日	2019年5月11日	2019年5月15日	55	程序员3								
57			课程试看	3 个工作日	2019年5月15日	2019年5月17日	56	程序员3								
58			课程购买	4 个工作日	2019年5月18日	2019年5月22日	57	程序员3								
59			课程收藏	5 个工作日	2019年5月24日	2019年5月30日	58	程序员3								
60			个人中心模块	20 个工作日	2019年5月4日	2019年5月30日										
61			修改个人信息	6 个工作日	2019年5月5日	2019年5月10日	59	程序员4								
62			个性化设置	7 个工作日	2019年5月11日	2019年5月20日	61	程序员4								
63			成长里程	1 个工作日?	2019年5月30日	2019年5月30日	62	程序员4								
64			阅读模块	21 个工作日	2019年5月2日	2019年5月30日										
65			文章详情	6 个工作日	2019年5月5日	2019年5月10日	63	程序员1, 程序								


项目：明心心理咨询WBS 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置	资源名称	2019三月25	一	二	三	四	五	六	日	2019三月26
66	🔴	🚀	文章添加	7 个工作日?	2019年5月21日	2019年5月29日	65	程序员1,程序									
67	🔴	🚀	文章删除	1 个工作日?	2019年5月30日	2019年5月30日	66	程序员1,程序									
68		🚀	项目监控	8 个工作日	2019年5月15日	2019年5月24日											
69		🚀	各项指标监控	0 个工作日	2019年5月19日	2019年5月19日	40	程序员4,架构									
70		🚀	资金安全监控	0 个工作日	2019年5月21日	2019年5月21日	69	UI设计师,程									
71	🔴	🚀	变更评审	1 个工作日	2019年5月23日	2019年5月23日	70	程序员1,程序									
72	🔴	🚀	例会	1 个工作日	2019年5月24日	2019年5月24日	71	程序员3,架构									
73		🚀	管理干系人	8 个工作日	2019年5月23日	2019年6月3日											
74	🔴	🚀	发布项目信息	4 个工作日	2019年5月25日	2019年5月29日	71	程序员3,架构									
75	🔴	🚀	报告监控指标	3 个工作日	2019年5月30日	2019年6月1日	74	程序员1,程序									
76	🔴	🚀	干系人沟通	2 个工作日	2019年6月1日	2019年6月3日	75	程序员2,项目									
77		🚀	团队建设	8 个工作日	2019年6月4日	2019年6月13日											
78	🔴	🚀	培训	4 个工作日	2019年6月4日	2019年6月7日	76	程序员1,程序									
79	🔴	🚀	娱乐活动	3 个工作日	2019年6月6日	2019年6月9日	78	程序员3,架构									
80		🚀	沟通	1 个工作日	2019年6月13日	2019年6月13日	79	UI设计师,测									
81		🚀	采购	4 个工作日	2019年6月14日	2019年6月19日	80	程序员3,架构									
82		🚀	项目验收	2 个工作日	2019年6月20日	2019年6月21日	81	测试员,程序									
83		🚀	收尾	1 个工作日?	2019年7月12日	2019年7月12日											
84	🔴	🚀	项目终验	1 个工作日	2019年7月12日	2019年7月12日	82	UI设计师,测									
85	🔴	🚀	结束采购	1 个工作日?	2019年7月12日	2019年7月12日	84	UI设计师,测									
86	🔴	🚀	项目内部收尾	1 个工作日?	2019年7月12日	2019年7月12日	85	UI设计师,测									



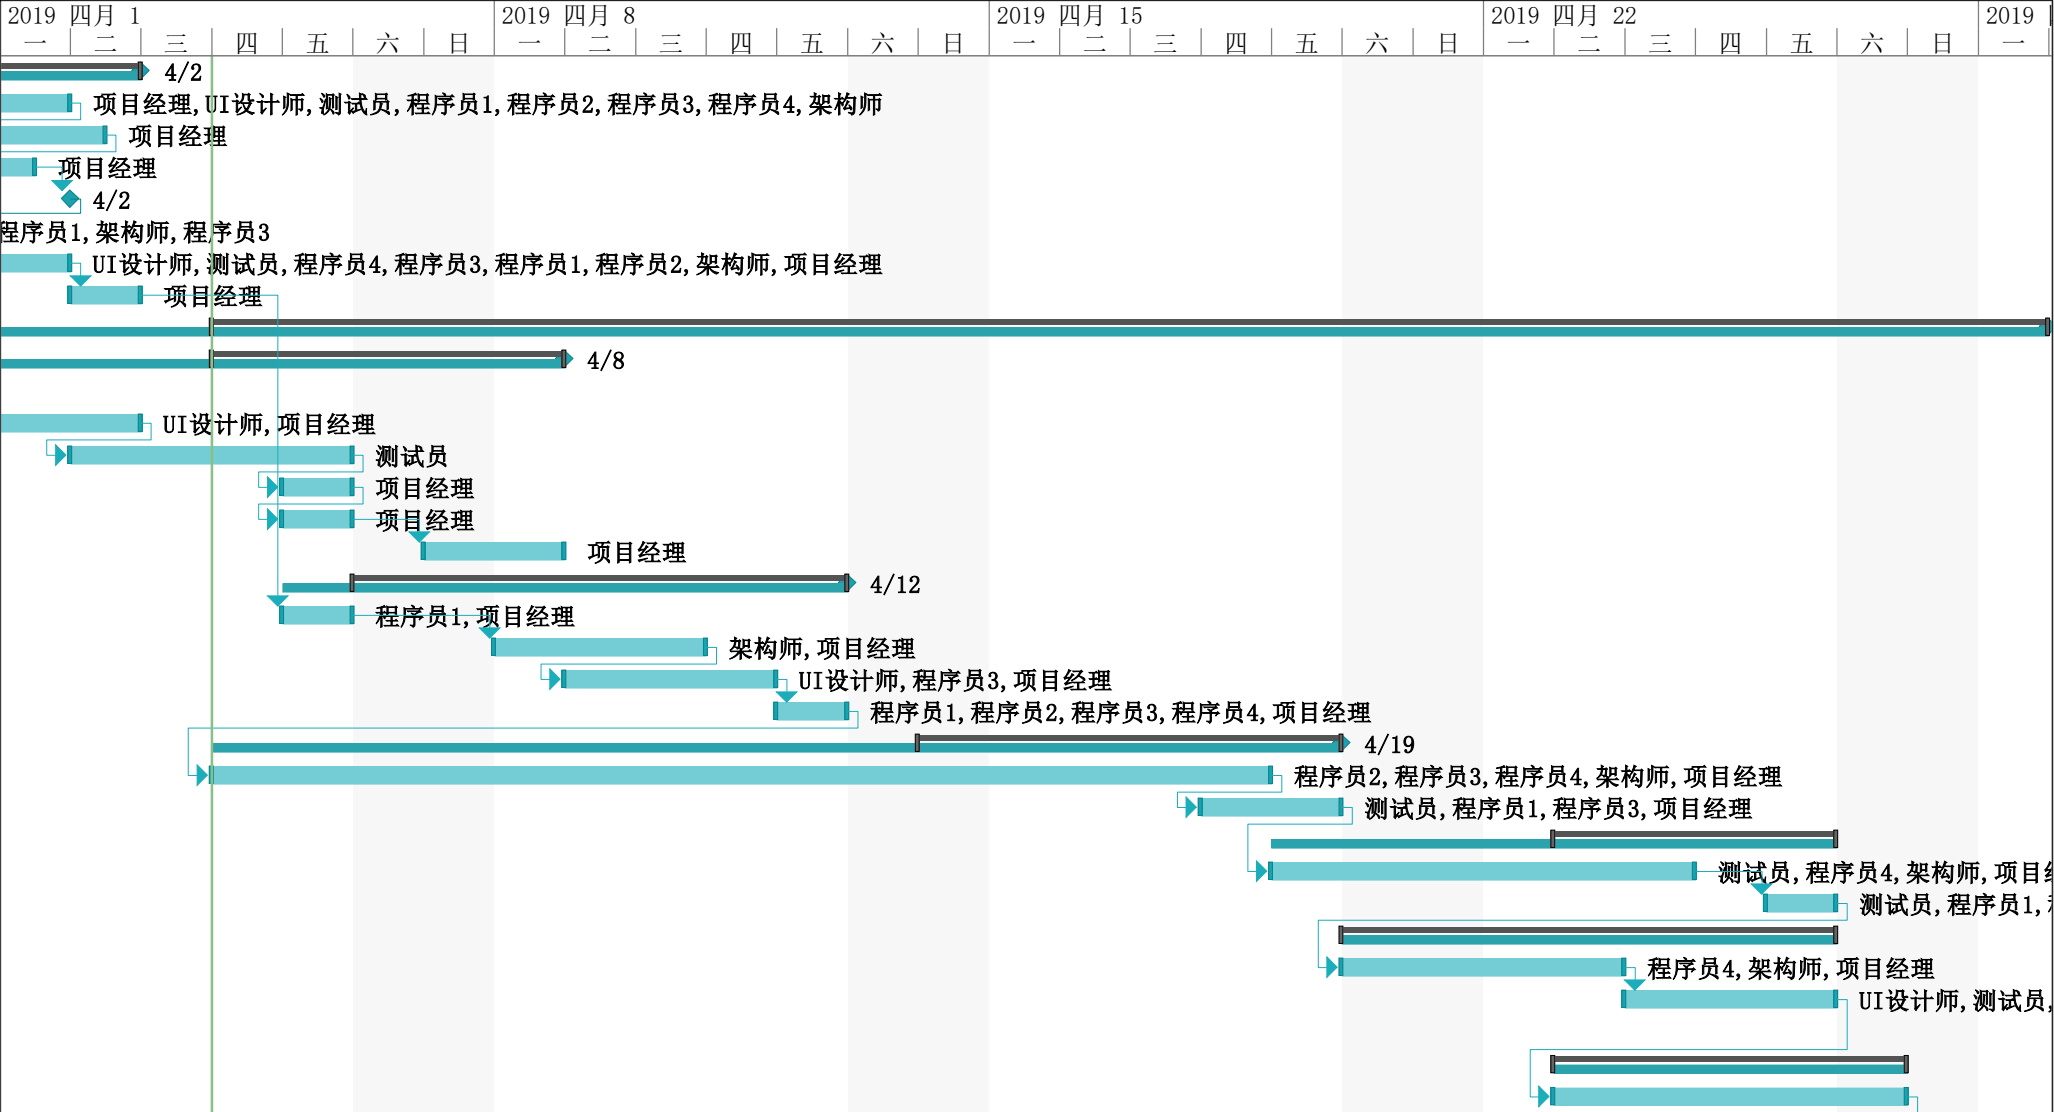



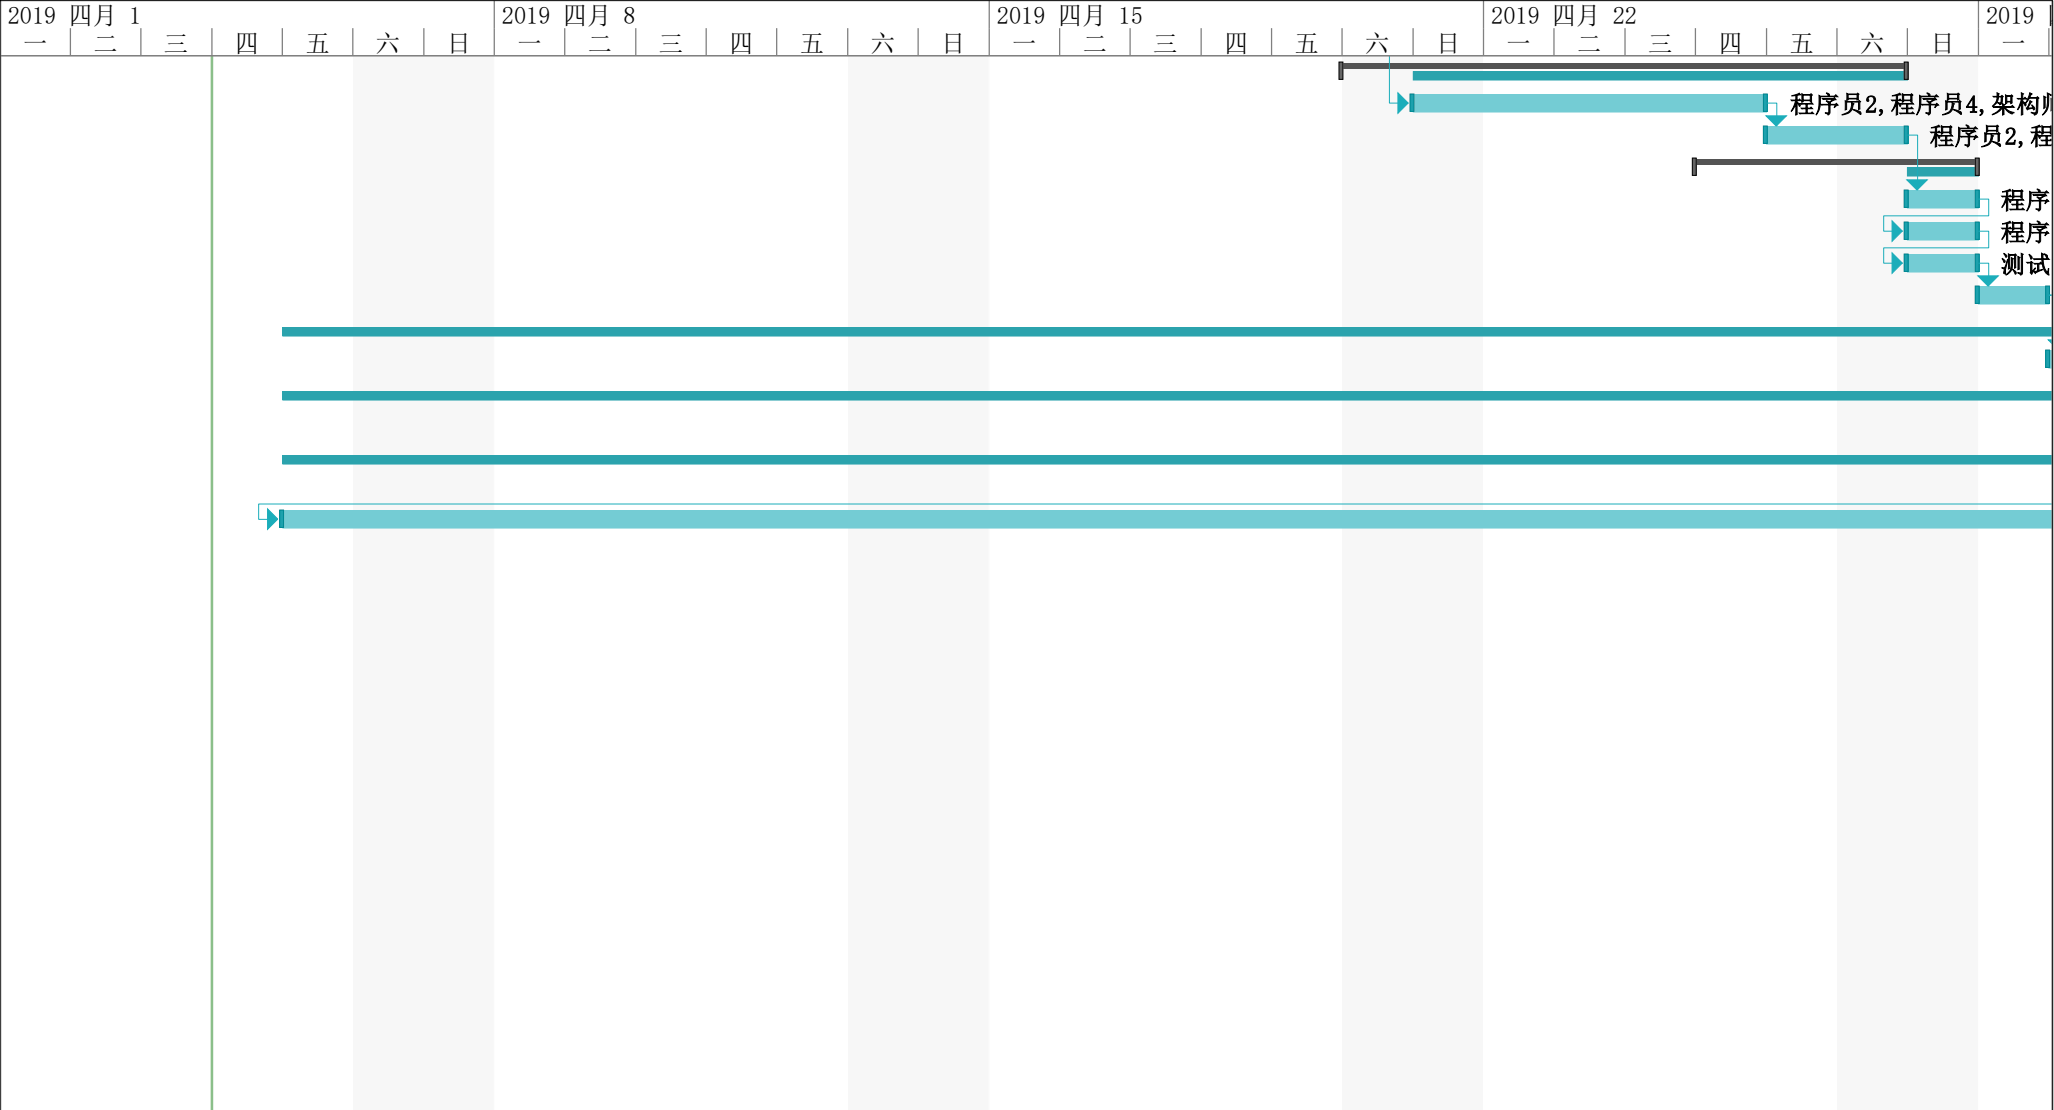












项目：明心心理咨询WBS 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：明心心理咨询WBS 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			




项目：明心心理咨询WBS  
日期：2019年4月4日

任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			


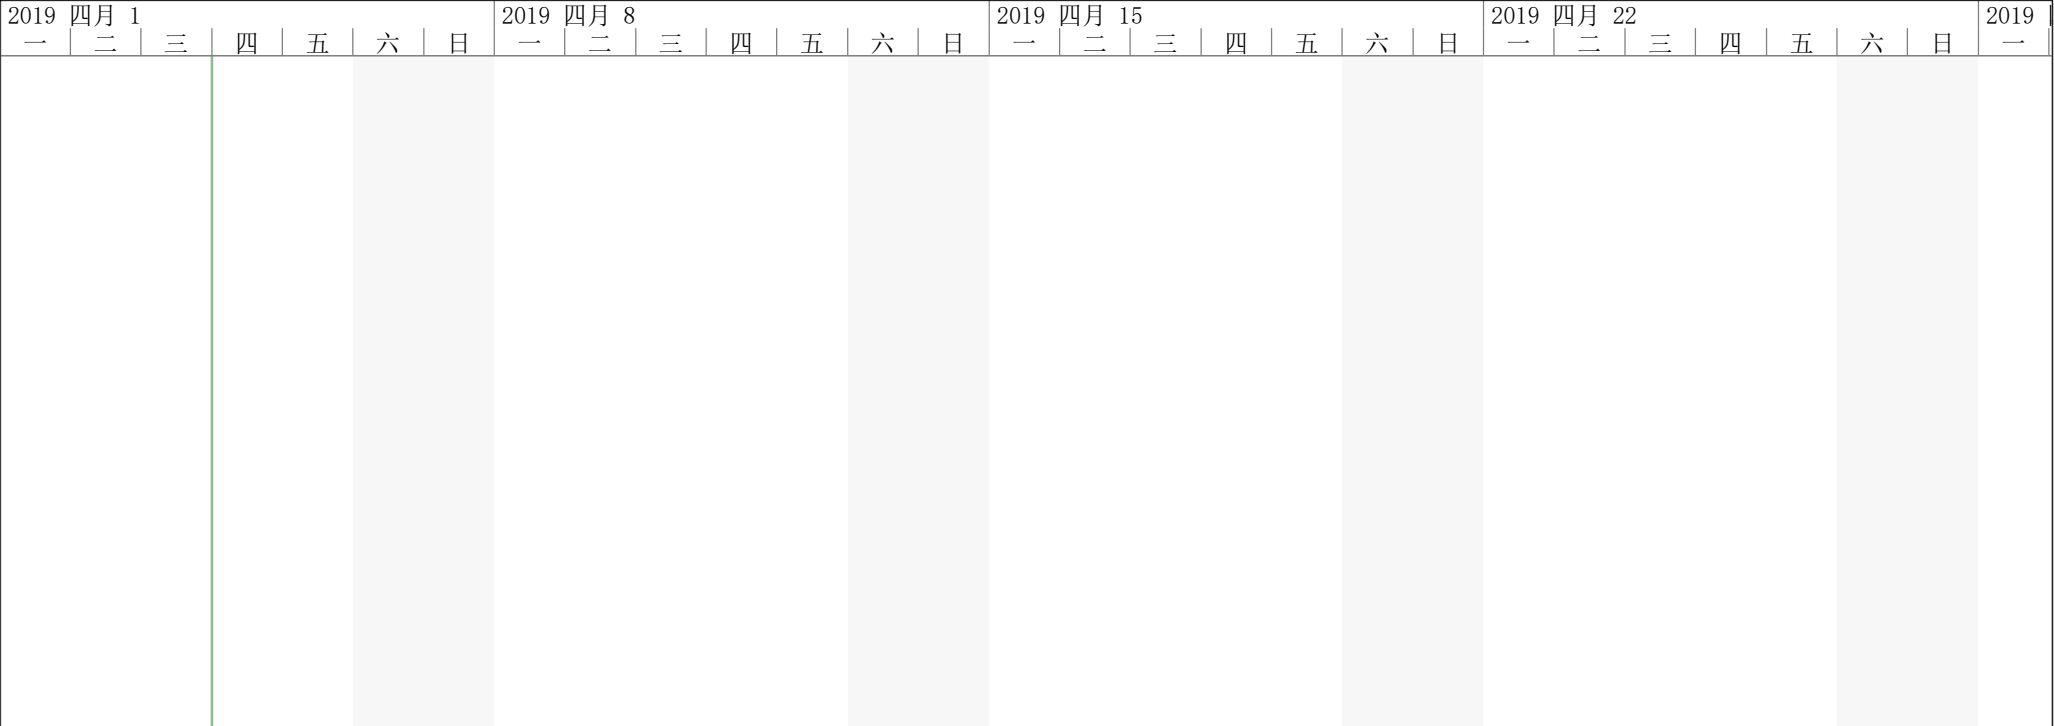


项目：明心心理咨询WBS 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			







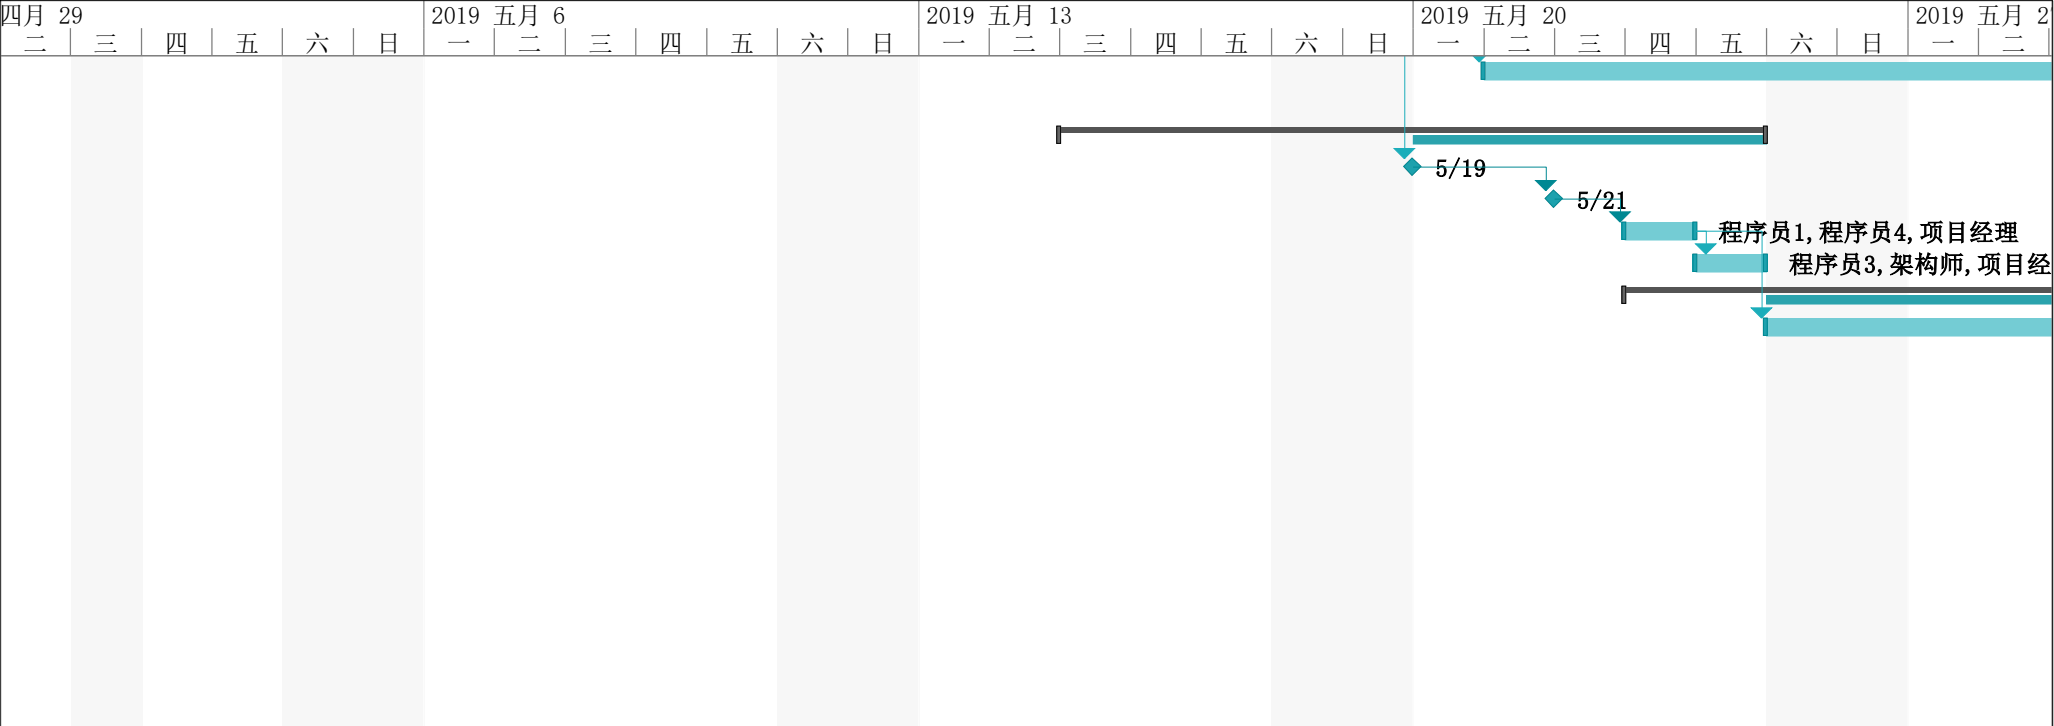



项目：明心心理咨询WBS 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			


					2019 六月 3							2019 六月 10							2019 六月 17							2019 六月 24		
三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三

项目：明心心理咨询WBS  
日期：2019年4月4日

名称	图标	名称	图标	名称	图标	名称	图标
任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			





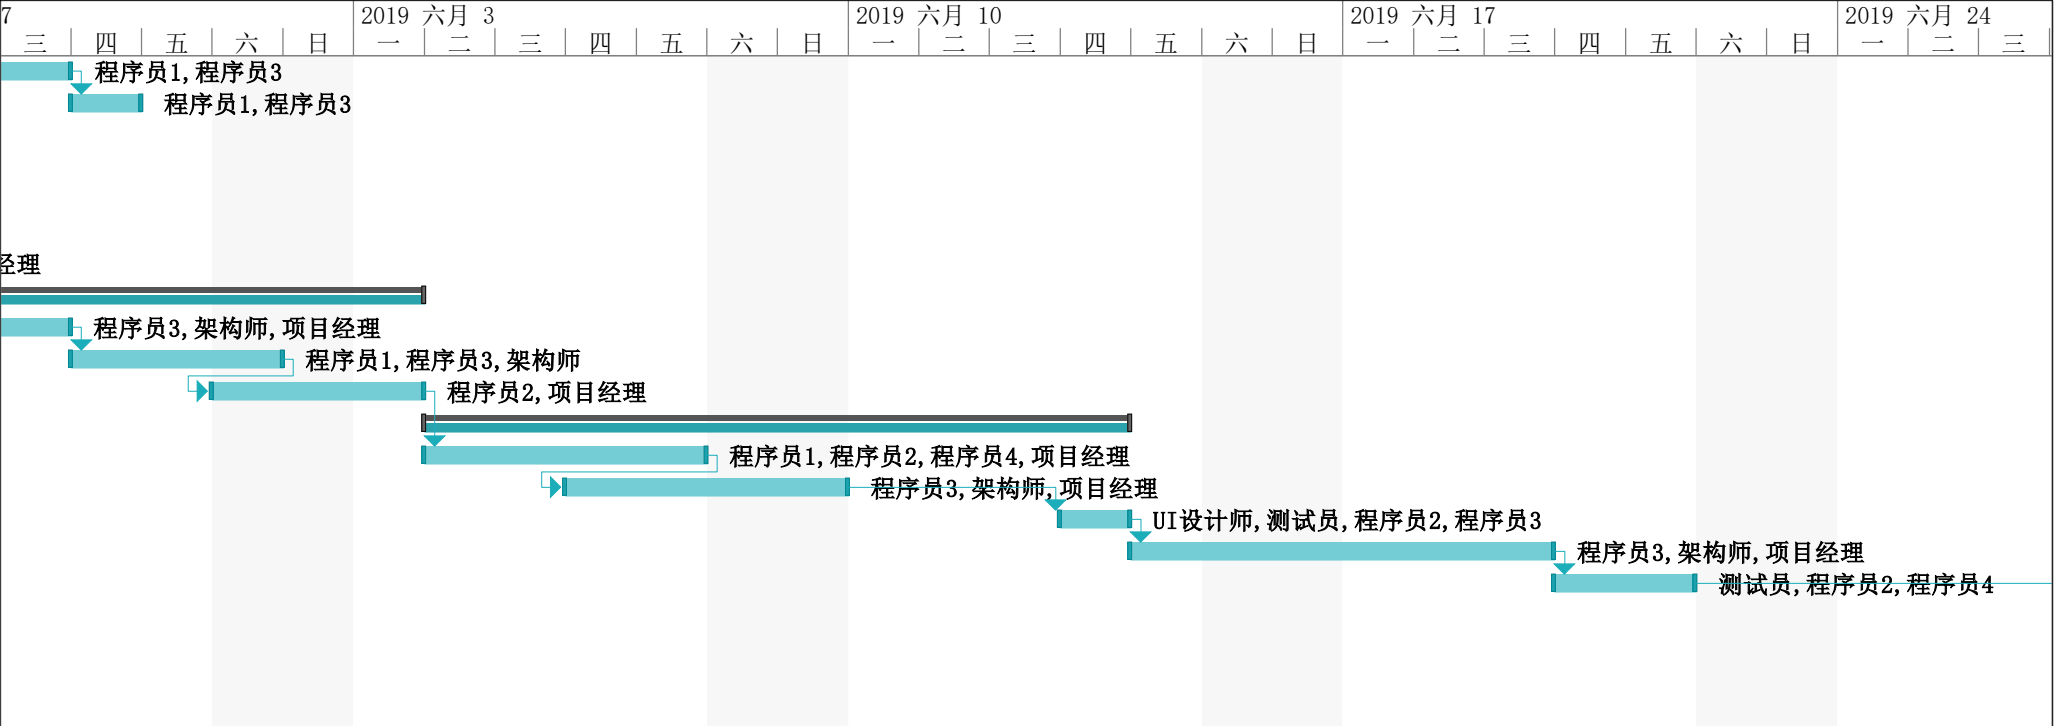















项目：明心心理咨询WBS 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：明心心理咨询WBS 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

[illegible]

项目：明心心理咨询WBS 日期：2019年4月4日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务	
